Guedala Park

Caderno para revisão do arquiteto

Anteprojeto | emissão 04/11/2026 | não enviado

Estudo nominal. Não executar. Medidas acabadas, compatibilização profissional e detalhamento executivo pendentes.

Componente	Referência e limite
Modelo FreeCAD	R55 vigente, arquivo incluído sem alteração.
Pranchas no anexo	R02, referência dos desenhos R55; 20 folhas A3 preservadas em tamanho original. Extração arquitetônica R55; referências da caixa e envelope completo distinguidas.
Pontos	R01: 53 funções, E06 adiada; posições e circuitos por compatibilizar.
Materiais	Caderno R01: identidades comerciais revistas em 04/11; amostras, lotes e variantes pendentes.
Revisão	13 questões da base arquitetônica + 10 interfaces prioritárias.
Levantamento	532 registros de preparação, nenhum valor medido preenchido.

Solicitação ao arquiteto

Confirmar o escopo de levantamento e revisão; conciliar níveis, paredes/vãos e áreas; definir as interfaces de instalações e manutenção; indicar o formato editável necessário e as disciplinas/RT responsáveis.

Intercâmbio: FCStd nativo disponível. IFC/DWG/DXF/STEP não exportados; escolher formato e finalidade com o destinatário antes da conversão.

SHA256 do CAD: 4a9026956aa4557a2fa392f4c02c308f93eabb3bbda6d7bd3ddd927777cd216c

Layout de referência

Planta mobiliada R03, cena R55; representação visual da R55. A vista inclui apresentações de acabamento do site, inclusive verde na janela do box, incorporado no CAD vigente. Sem escala.



Imagem ilustrativa · sem cotas · medidas a conferir

Geometria R55 · cores aproximadas

Níveis de projeto e levantamento

Referência	Demais ambientes	Banheiro
Teto acabado de projeto	2550 mm nominal	2300 mm nominal
Fonte	Elias, 01/11/2026; roteiro de campo PD-*	Elias, 01/11/2026; roteiro de campo PD-BAN
Levantamento real	Pendente	Pendente
Revisão necessária	Piso acabado, teto, forro e fechamentos	Piso acabado, teto, forro e instalações

Quadro de referências sem escala, não é corte construtivo. Não reutilizar a comparação antiga 2570 versus 2600/2500 mm. As alturas de projeto não comprovam espessuras de piso ou forro. Medir piso/teto acabados e desníveis antes de ajustar a envoltória ou os fechamentos dos armários. ARQ-01/11/12.

Materiais e acabamentos

Extrato da seção 1 do Caderno de especificações R01. A fonte completa acompanha o pacote. Mesma chapa física: mesmo acabamento nas duas faces; peças distintas exigem identificação e compatibilização. Amostras e códigos comerciais ainda condicionados.

Material	Ambientes	Situação	Observação
Estofado claro · cadeiras Lina	Sala + jantar	Referência aprovada	Composição clara com estrutura amadeirada.
Branco TX · interiores	Sala + jantar, Quarto, Escritório, Cozinha, Lavanderia, Banheiro	Escolhido	Faces internas identificadas nas fichas.
Espelho · frente do espelheiro	Banheiro	Escolhido	Representação clara do espelho, sem simulação de reflexos.
Greenplac Arenza	Cozinha, Escritório, Lavanderia, Sala + jantar, Quarto	Escolhido / referência	Escolhido na cozinha/escritório e testeira.
Guararapes Azul Petróleo	Cozinha	Escolhido	Armários superiores contínuos da geladeira ao cooktop.
Duratex Azul Profundo	Cozinha	Alternativa	Alternativa de chapa à cor principal, ainda não escolhida.
Granito Branco Itaúnas	Cozinha, Lavanderia, Banheiro	Escolhido	Pedra natural. Padrão e cor variam por lote.
Algodão Egípcio	Sala + jantar, Quarto, Escritório, Cozinha, Lavanderia, Banheiro	Escolhido	Na cozinha e lavanderia, acabamento fosco com resistência à limpeza escolhido.
Off-white fosco	Sala + jantar, Escritório, Quarto	Escolha para o projeto	Frentes lisas e claras.
Inox Look	Cozinha, Lavanderia	Escolhido	Acabamento escolhido para IB6S e LG VC4.
Bouclê bege-claro · Bonnie	Sala + jantar	Escolhido	Modelo e versão de referência escolhidos.
Cinza-claro · Daiane	Escritório	Escolhido	Cinza-claro aprovado.
Bege / greige estofado	Quarto, Sala + jantar	Proposta a conferir	Cabeceira clara aprovada como composição.
Portobello Vivant Sauge Mate	Banheiro	Escolhido	RB-01 · 7 × 24,4 cm · paredes focais do box (fundo e janela, 30/10/2026).
Travertino Reale Greige	Banheiro	Escolhido	Biancogres PB-01 Satin 90 × 90 cm.
Eliane Iseo Marfim AC	Lavanderia	Escolhido	PL-01 · 90 × 90 cm. Entrega cerâmica.
Preto / grafite	Todos	Escolhido	Metais, pedestal, eletrônicos e detalhes.
Tarkett Ambienta Design Olmo · 24192727	Sala + jantar, Quarto, Escritório, Cozinha	Opção preferida	Vinílico em toda a casa, exceto banheiro/lavanderia.
Arauco Beige Matt · banheiro	Banheiro	Escolhido	Frentes fechadas e foscas, sem ripado nem puxadores salientes.
Arauco Louro Freijó Poro · laterais do banheiro	Banheiro	Escolhido	Laterais aparentes do gabinete e do armário com espelho.

Identidade comercial dos acabamentos

Conferência documental de 04/11/2026. Os códigos abaixo identificam referências, não compra, lote ou amostra recebida. Fontes oficiais e detalhes de chapas/bordas nas seções 4 e 5 do Caderno de especificações incluído no ZIP.

Material / aplicação	Identificação documentada	Pendência exata para fechar
Vinílico Olmo	Tarkett Ambienta, coleção Design, 24192727, régua 208 × 1230 mm; fabricante	Cotação por código, lote, sistema de instalação e complementos; quantidades após conferência, sem trocar a opção preferida por compra decidida
Verde RB-01	Portobello Vivant Sauge Mate Bold, 7 × 24,4 cm; 204214 no catálogo nacional 2023, p.57 impressa; 204214E na página de exportação	Confirmar código nacional vigente, lote, disponibilidade e amostra. Não substituir por Brilho 204204 ou Ligne 204224; códigos do catálogo histórico não demonstram estoque atual
Piso PB-01	Biancogres Travertino Reale Greige Satin, 90 × 90 cm; fabricante identifica acetinado, retificado, 8 mm, tamanho de trabalho 895 × 895 mm	Código/EAN da embalagem e lote a solicitar; não trocar por EXT/STR nem usar 900 mm como dimensão real da peça. Página confirma família/variante, não implantação
Piso PL-01	Eliane Iseo Marfim AC 90 × 90, referência de página 8066903 / polo BA, acetinado retificado; fabricante	Confirmar polo/código efetivamente ofertado e lote; AC não é EXT. Produto identificado, compra e quantidade pendentes
Pintura Algodão Egípcio	Referência Suvinil F100, NCS 0804-Y36R; cartela oficial	A cor está definida no projeto; marca/linha/base e acabamento por ambiente ainda precisam ser confirmados. O código Suvinil não escolhe automaticamente o produto nem equivale à fórmula de outra marca
Granito Branco Itaúnas	Nome comercial da pedra escolhido; fornecedor/lote ainda não identificados	Apresentar foto e amostra da chapa efetiva, acabamento, bordas e tratamento proposto; não inventar SKU universal para pedra natural
Cortina C2 Areia	Referência visual interna do projeto, aspecto de linho; sala	Fabricante, coleção, código de cor, composição, largura, transparência e manutenção. C2 não é código comercial comprovado
Suede areia do banco/cabeceira	Direção de tecido/cor registrada no estado; composição comercial não identificada	Fornecedor, coleção/cor, composição e amostra física; não substituir por qualquer tecido vendido como areia
Rodapé 8 cm e espelhos	Diretrizes do projeto, sem SKU único fechado	Fabricante/modelo/material/acabamento e acessórios do rodapé; produto/acabamento de bordas do espelho pela oficina. Medidas e recortes depois do levantamento

Chapas: Arenza Colore/Lizze, Azul Petróleo Colors/Matt, Beige e Louro Freijó Poro documentados. Lume/Areia continuam alternativas sujeitas à amostra; Branco TX ainda exige fabricante. Não presumir equivalência de cor, classe do substrato ou formato de chapa.

Iluminação: compatibilidade documental

Revisão de 04/11/2026. Identificação de componentes não comprova compatibilidade do conjunto. A lista curta completa acompanha o pacote com links oficiais; preços são históricos de 27/10. Não houve ensaio ou resposta direta de fornecedor.

Conjunto	Confirmado em fonte primária	O que permanece pendente
WiZ A60 / IL02	WiZ Brasil: 12NC 929002424712, EAN 8718699787370, E27, 127 V, 8,8 W, 800 lm; aplicativo/voz	O anúncio cotado de 806 lm/bivolt não demonstra ser esse SKU. Solicitar etiqueta do lote; não atribuir preço ou características de uma variante à outra
WiZmote / IL02	Suporte WiZ: liga, apaga e regula; após configuração comunica diretamente com as luzes mesmo sem internet/roteador	Conferir SKU do controle, pilhas, base e fornecimento. As luzes precisam permanecer energizadas; WiZmote não é controle universal para Elgin ou Shelly
Jurerê / IL03	Taschibra: 52040021-01, branco, 2×E27, vidro fosco; lâmpadas não incluídas	Potência máxima do soquete não demonstra condição térmica das WiZ. Confirmar fechamento, orientação, ventilação e uso da variante exata
Elgin do quarto / IL09	Família oficial: Elgin Smart, Wi-Fi, Alexa/Google e dimerização	Página da família não entrega manual nem comando físico de regulagem específico da 48D18WSRWIFI. Solicitar SKU do acessório, uso sem internet e comportamento após retorno de energia; interruptor comum só corta alimentação
Shelly / IL05	Documentação oficial: SNDC-0D4P10WW, alimentação 12/24 V CC, entradas para botão; API oficial confirma controle de brilho pelas entradas no perfil light	Validar contato/corrente do pulsador escolhido, modo e firmware do conjunto. Manual permite operação independente da nuvem; isso não comprova Alexa sem internet nem compatibilidade com qualquer botão
Pulsador / IL04	Tramontina: 57115027, pulsador de campainha, 10 A/250 V	Não há comprovação encontrada dos limites mínimos de contato no sinal CC do Shelly. A indicação 10 A/250 V não responde essa pergunta; ligação final pelo instalador
Fonte / IL06	Ficha Opus: OPS31002, entrada 100-240 V CA, saída 12 V CC, 36 W/3 A, corpo 172 × 21 × 20 mm	Referência de catálogo atual resolve 172/270 mm no papel; conferir o lote entregue. Compatibilidade da fonte com a carga modulada pelo Shelly, dissipação e acesso em móvel ainda pendentes
Cristallux / IL07	3000 K: CLX-FT431230 / 221506; 4000 K: CLX-FT331240 / 221513	Conciliar a variante 4000 K com o anúncio da loja. A ficha 3000 K publica 12 W/m, 12 V e 0,1 A/m, incompatíveis entre si; pedir correção escrita. Não dimensionar fontes, trechos ou cabos com esse dado conflitante
Brilia banheiro / IL07	Fabricante: 318939, 3000 K, 12 V, 4,8 W/m, rolo 5 m, largura 8 mm, corte a cada 25 mm	Perfil, conexões e proteção após cortar continuam pendentes; o passo de catálogo não define comprimento de obra
WiZ E05 / IL08	Ficha WiZ: 929002681171 / EAN 8719514336957, kit 2 m, 20 W, 100-240 V	Relacionar etiqueta do anúncio kf72hc7016 ao código oficial e confirmar fonte, controlador, plugue, corte/reconexão. Não acrescentar fonte Opus ou controle duplicado ao kit
Jantar D1 / IL09	ITEAD/Sonoff: D1 para LEDs dimerizáveis; controle por RM433, aplicativo e Alexa; entrada 100-240 V CA	Isso não demonstra compatibilidade com três Brilia 314450. Faltam documentação da G9, carga mínima, faixa útil e ensaio conjunto. Oferta oficial de kit pode incluir RM433 sem base; confirmar a composição da oferta nacional para não duplicar controle
EVY / IL09	Nordecor: 2054 / D1387 branco, 3 W, 3000 K, 100-240 V, IP20	A página consultada não especifica o interruptor da peça; confirmar foto/manual do lote e acionamento independente de cada lado

Manter fontes e controladores acessíveis para manutenção. Posições, condições térmicas, circuitos e ligações dependem do levantamento e revisão técnica; não executar a partir deste quadro.

Primeira etapa e limites financeiros

D05-C: Elias, 27/10/2026, 'C - cotar com aumento de verba'. D06-B: Elias, 27/10/2026, 'B - adiar só E06/prateleiras, manter E05/TV para cotação'. O modelo mostra o projeto integral; presença no desenho não significa inclusão na primeira etapa.

Tratamento	Escopo
Adiados na marcenaria	C01 cabeceira; C03 encosto/almofadas do banco; C04 painel/prateleiras TV; C05 complementos do escritório; P16 gavetas; P17 aéreo do escritório.
Outros adiados	M05 Daiane, M06 tapete, M08 cortina do escritório; E06 de iluminação. M09 cortina do quarto é exclusão de escopo, não compra futura.
Preservar	Quarto e banco-baú, bancada e apoios próprios, TV da sala e E05. Cama viúva atual; queen futura. Ferragens laterais com amortecimento na marcenaria retida.
Interfaces para revisar	TV/PS5 e indiretas sem complementos adiados; suporte da soundbar; manutenção e acesso. Não atribuir custo zero nem presumir independência construtiva.

Referência parcial da etapa escolhida: R$ 127.589,02 a R$ 127.619,02, usando a provisão documental do PE12G e a faixa histórica da TAB4000. Reserva fixa de R$ 10.000 separada: recursos de referência R$ 137.589,02 a R$ 137.619,02. Excesso sobre o limite-base de execução de R$ 120.000: R$ 7.589,02 a R$ 7.619,02. Não é preço fechado nem intervalo do custo final: pacote de marcenaria, preços e lacunas continuam condicionados. Não altera o limite-base ou autoriza gasto.

Memória financeira completa no arquivo Orcamento_R43.md incluído no ZIP; o nome é legado. Valores documentais não são contratação. Bens existentes e compras fora da verba estão separados na abertura do documento.

Base arquitetônica: 13 questões

Revisão de 01/11, com referências conciliadas em 04/11/2026; fechamento físico/técnico pendente. IDs correspondem aos CSV incluídos, com fontes e critérios completos.

ARQ-01 | Níveis e teto

Alturas acabadas de projeto: 2550 mm nos demais ambientes e 2300 mm no banheiro (Elias,01/11/2026). Levantamento real pendente; comparação antiga 2570 versus 2600/2500 superada, sem deduzir composição de piso/forro.

Encaminhamento: Qual a distância do piso acabado ao teto acabado em cada trecho? Há forro ou desnível?

Responsável: Arquiteto/levantamento/RT. Critério completo no CSV, ID ARQ-01.

ARQ-02 | Paredes

Envoltória com paredes de 100 mm nominais; contornos PR-WALLS reconstruídos, sem medidas reais.

Encaminhamento: Quais as faces acabadas, espessuras, prumos e esquadros reais? Quais panos são compartilhados?

Responsável: Arquiteto/levantamento/RT. Critério completo no CSV, ID ARQ-02.

ARQ-03 | Porta de entrada

Passagem livre de projeto 800 x 2100 mm; demais portas 800 x 2100, banheiro 700 x 2100 (README do modelo, atualização 01/11/2026). Vão bruto, folha, batentes e posição dependem do levantamento; valores da revisão anterior não representam a porta vigente.

Encaminhamento: Quais as posições, largura/altura do vão, folha, batente, guarnição e sentido de abertura reais?

Responsável: Arquiteto/levantamento. Critério completo no CSV, ID ARQ-03.

ARQ-04 | Janelas

Tabela do CAD usa peitoril/envoltória 920/1130 mm; registros PR-JANELA usam vidro Z950/H1100. Diferença inclui soleira de 30 mm; são grandezas distintas.

Encaminhamento: Quais os vãos brutos e acabados, peitoris, marcos e limites do vidro?

Responsável: Arquiteto/levantamento. Critério completo no CSV, ID ARQ-04.

ARQ-05 | Portas internas e pranchas

PR-PORTA guarda envelopes anteriores de folhas e posições, não levantamento do vão bruto com batentes; novas esquadrias estão no R55.

Encaminhamento: Onde começam e terminam os vãos e qual a passagem útil após batente e acabamento?

Responsável: Arquiteto/levantamento. Critério completo no CSV, ID ARQ-05.

ARQ-06 | Quadro de áreas

CAD corrigido 35,7051 m² versus H01 35,4583 m²; delta +0,2468 m². Soleiras/passagens e divisão sala/cozinha mantêm critérios distintos da área privativa 40,18 m².

Encaminhamento: Que contorno e regra de atribuição de soleiras/passagens serão usados no quadro de piso e orçamento?

Responsável: Arquiteto; quantitativos após decisão. Critério completo no CSV, ID ARQ-06.

ARQ-07 | Lavanderia

CAD corrigido 1290 × 1540 mm, parede 170 mm; transição lateral 0,0616 m². Área CAD 2,0482 versus H01 1,9866 m². Loop +15 mm, folga ao rodapé 10 mm. Fonte: Elias, 01/11/2026, "Sim, incorporar essa correção".

Encaminhamento: Qual a distância transversal entre faces acabadas e onde termina a transição para cozinha?

Responsável: Arquiteto/levantamento. Critério completo no CSV, ID ARQ-07.

ARQ-08 | Folgas negativas

Quatro valores: P07 X/início -13 mm; P09 X/início -25 mm; P15 X/fim -15 mm; Peca357 X/fim -40 mm. Todos sem parede física identificada no CSV.

Encaminhamento: Esses limites são paredes reais, panos abertos ou divisões do retângulo de referência? A que elemento corresponde Peca357 em campo?

Responsável: Arquiteto/levantamento. Critério completo no CSV, ID ARQ-08.

ARQ-09 | Folgas de montagem

34 folgas ≤15 mm na base anterior: 4 negativas, 24 nulas e 6 positivas de 10 mm. Proposta de 10 mm com arremate não foi adotada.

Encaminhamento: Em quais lados existe parede e qual folga/arremate será aceito após levantamento?

Responsável: Elias decide aparência; arquiteto/oficina definem montagem. Critério completo no CSV, ID ARQ-09.

ARQ-10 | Datum e coordenadas

CSV PR usa X espelhado pelo PR-EIXO-X nominal de 7400 mm. Gerador converte caixa X para [eixo-Xmax,eixo-Xmin]. M0/M1 não têm vínculo físico demonstrado.

Encaminhamento: Quais marcos físicos definem origem, direção e transformação entre levantamento, CAD e planta?

Responsável: Arquiteto/levantamento. Critério completo no CSV, ID ARQ-10.

ARQ-11 | Encontro com teto

Armários até o teto são diretriz de 26/10/2026; fechamentos e interfaces permanecem nominais. Modelo não define teto acabado nem tolerância de montagem.

Encaminhamento: Como executar fechamento e acesso de montagem/manutenção diante do teto real?

Responsável: Arquiteto/oficina; Elias para aparência. Critério completo no CSV, ID ARQ-11.

ARQ-12 | Soleiras e rodapés

Pisos/soleiras desenhados em Z -50..0 mm; espessura é representação nominal, não composição construtiva comprovada. Rodapé nominal 80 × 15 mm, com cortes nos batentes.

Encaminhamento: Quais camadas, espessuras, transições e produtos serão usados? Como tratar a transição sob a porta do banheiro?

Responsável: Arquiteto/RT/oficina. Critério completo no CSV, ID ARQ-12.

ARQ-13 | Representação arquitetônica

Pranchas R02/R55 reexportadas e conciliadas em 02/11/2026; caixas P07/P16/P20 distinguidas dos envelopes completos. Pendência antiga de exportação documental resolvida; levantamento e revisão profissional permanecem.

Encaminhamento: Após o levantamento, quais vãos, contornos e interfaces precisam de revisão nas plantas e elevações?

Responsável: Projeto/autor do exportador; arquiteto revisa. Critério completo no CSV, ID ARQ-13.

Instalações e manutenção: 10 interfaces

Revisão de 01/11, com referências conciliadas em 04/11/2026; fechamento físico/técnico pendente. IDs correspondem aos CSV incluídos, com fontes e critérios completos.

INT-01 | Cozinha/lavanderia

Cocção × lavadora: painel isolante LG e percurso de ventilação/retirada do Fischer ainda condicionados.

Encaminhamento: Conferir em um corte conjunto painel isolante 850 × 600 com alumínio, apoios, entradas/saídas de ar, grelhas removíveis e retirada dos aparelhos; MDF 18 não demonstrado equivalente.

Responsável: Arquiteto/oficina; RT valida instalação. Critério completo no CSV, ID INT-01.

INT-02 | Cozinha

Micro-ondas: 10 cm desejados acima versus 30 cm do manual, conforme divergência já registrada.

Encaminhamento: Submeter nicho/equipamento à solução técnica antes de fechar marcenaria; preservar a exigência registrada do manual até comprovação aplicável.

Responsável: Arquiteto/RT; Elias decide eventual mudança de layout/produto. Critério completo no CSV, ID INT-02.

INT-03 | Lavanderia

E21 × varal: arranjo lateral não cabe no trecho nominal ensaiado; terminal, ventilação permanente, registros e acessos não implantados.

Encaminhamento: Localizar saídas e infraestrutura entregues; desenhar E21, duto/terminal, ventilação, acesso aos registros e percurso do varal com roupa na mesma elevação. Não usar depurador como substituto da exaustão do E21.

Responsável: Arquiteto/RT/construtora; instalador de gás. Critério completo no CSV, ID INT-03.

INT-04 | Cozinha/lavanderia/banheiro

Água quente: C06 não confirmada; entrada quente da Telca não representada por código próprio; rotas da pia/ducha do banheiro não escolhidas.

Encaminhamento: Levantar alimentações e derivação privativa; definir esquema quente/fria e acessos, incluindo Telca. Conferir vazão/pressão dos produtos e funcionamento individual dos pontos antes de escolher rota; não repetir simulação nominal.

Responsável: Arquiteto/RT; fornecedores dos metais. Critério completo no CSV, ID INT-04.

INT-05 | Cozinha/lavanderia

Conexões podem disputar espaço com cesto P14, sifão, contrapeso Telca e armários; retirada de aparelhos permanece pendente.

Encaminhamento: Conferir cesto em movimento e retirada do saco, sifão/engates, mangueira/contrapeso, tomadas e retirada de lavadora, purificador e geladeira. Usar nível de pedra 920 mm como diretriz, a compatibilizar.

Responsável: Arquiteto/oficina/instalador após levantamento. Critério completo no CSV, ID INT-05.

INT-06 | Banheiro

BC43 × porta/vaso × Arion/espelheiro: percurso removível e folgas nominais não comprovam acesso real.

Encaminhamento: Conferir porta/maçaneta, retirada do quadro, acesso aos M6/sifão e envelope da alavanca Arion com portas do espelheiro e barra de luz. Manter torneira centralizada atrás da cuba.

Responsável: Arquiteto/oficina; fornecedor do metal. Critério completo no CSV, ID INT-06.

INT-07 | Banheiro

Água, luz e box até o teto precisam compartilhar cortes sem bloquear acesso ou presumir proteção elétrica pelo vidro.

Encaminhamento: Demarcar posições de ducha/misturador, perfis/fontes e três comandos; RT define proteção, volumes e percursos próprios. Conferir fixação/vedação do box com teto real.

Responsável: Arquiteto/RT/instaladores. Critério completo no CSV, ID INT-07.

INT-08 | Cozinha/lavanderia

Luz × portas/varal: centros e altura de 150 cm da bancada são nominais; fonte/perfil ainda sem implantação final.

Encaminhamento: Marcar luminárias fora do giro dos armários e conferir sombra com roupa; detalhar fonte acessível da bancada e comando. Manter geral de cozinha/lavanderia com interruptor comum.

Responsável: Arquiteto/instalador; fornecedores IL04-IL07. Critério completo no CSV, ID INT-08.

INT-09 | Sala/quarto/escritório

S05/Q06/E05 sem coordenadas; E06 adiada. E05 deve ter suporte independente de P17; Elgin ainda depende de manual/comando físico.

Encaminhamento: Implantar as três indiretas com acesso às fontes; Q06 na cabeceira/face inferior acessível, sem fresta fictícia sobre armário. Preservar E06 adiada e grupos separados; fechar consultas IL02-IL09, sem selecionar substitutos nesta revisão.

Responsável: Arquiteto/instalador; fornecedores. Critério completo no CSV, ID INT-09.

INT-10 | Todos

Quadro/circuitos e posições entregues não levantados; contagem de funções não comprova tomadas, circuitos nem simultaneidade.

Encaminhamento: Conferir quadro, alimentação, tomadas/retornos e acessibilidade com mobiliário; RT fecha cargas/circuitos e proteção. Preservar 127 V de uso e conferir infraestrutura específica do ar-condicionado.

Responsável: RT/eletricista; arquiteto compatibiliza. Critério completo no CSV, ID INT-10.

Levantamento: datum e prioridades

O roteiro completo e o índice CSV de medidas acompanham o pacote. Esta folha resume a preparação; não substitui as descrições físicas pendentes.

1. Identificar M0 junto à entrada, M1 e direção da fachada em croqui/fotos; demonstrar vínculo com o referencial da planta antes de converter PR-X/Y.

2. Medir faces acabadas na linha a 1000 mm do piso, alturas e desníveis; identificar faces, instrumento e evidências. Janela: largura/altura livre e peitoril em três posições.

3. PR-EIXO-X = 7400 mm é referência nominal de espelhamento, não dimensão de campo comprovada. Registrar transformação, reflexão quando aplicável e ponto de conferência.

4. Campos sem medida permanecem vazios. Não usar zero, médias ou aparência do vídeo como medição da unidade.

15 prioridades do roteiro vigente

Ordem	Face ou pendência de identificação	Registro
1	Face acabada da parede atrás da bancada da cozinha e do tanque; marcar extremos do pano junto à cozinha e lavanderia.	Leitura/foto: _____
2	Face acabada da parede atrás da bancada da cozinha e do tanque; marcar extremos do pano junto à cozinha e lavanderia.	Leitura/foto: _____
3	Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui.	Leitura/foto: _____
4	Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui.	Leitura/foto: _____
5	Face acabada da parede da cabeceira e aéreo P04 no quarto; marcar os dois extremos do pano no croqui.	Leitura/foto: _____
6	Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui.	Leitura/foto: _____
7	Face acabada da parede da cabeceira e aéreo P04 no quarto; marcar os dois extremos do pano no croqui.	Leitura/foto: _____
8	Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui.	Leitura/foto: _____
9	Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui.	Leitura/foto: _____
10	Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui.	Leitura/foto: _____
11	Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui.	Leitura/foto: _____
12	Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui.	Leitura/foto: _____
13	Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui.	Leitura/foto: _____
14	Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui.	Leitura/foto: _____
15	Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui.	Leitura/foto: _____

Pranchas de referência: R02 / desenhos R55

As 20 folhas seguintes foram anexadas sem redimensionar. Plantas 1:50; elevações/detalhe 1:25. Imprimir A3 a 100%, sem ajustar ao papel; conferir a barra de 50 mm.

Incluem PL1-PL3 (paredes, layout e pontos), PT1-PT2 (pontos), E01-E12 (elevações), NC1 (triagem nominal de vãos) e DT1 (fechamento ao teto).

As pranchas usam a geometria ativa R55: corte das paredes, pisos, vãos e aparelhos. As referências da caixa de P07/P16/P20 são distintas do envelope completo mostrado. Levantamento, instalações e revisão profissional permanecem pendentes antes de uma emissão executiva.


As 23 questões anteriores e as fontes no ZIP são o complemento da revisão. O pacote está preparado para consulta ao arquiteto; não foi enviado e não comprova compatibilização física.

CADERNO A3 | R02 / CAD R55

PL1	Planta cotada - paredes e aberturas	Plantas 1:50; elevações e detalhe 1:25.
PL2	Planta de layout - envelopes CAD	Imprimir sem ajustar à página; conferir barra de 50 mm.
PL3	Planta de pontos R01	Caixas CAD são envelopes, não contornos de usinagem.
PT1	Pontos R01 - cotas e funções / 1	Fontes: CSV de medidas + Cotas.json + exportação CAD.
PT2	Pontos R01 - cotas e funções / 2	Campo medido vence nominal. Branco = pendência.
E01	Cozinha - face da bancada e aéreos	Ajustes ao teto são estudos separados da CAD.
E02	Cozinha - face oposta / interface da lixeira	Geometria R55; cotas nominais, levantamento pendente.
E03	Lavanderia - tanque, cesto e aéreo	Ver Impacto.json: alterações, fontes e conflitos.
E04	Banheiro - gabinete, bancada e espelho	
E05	Roupeiro - P01-P03 e maleiro / face principal	P07/P16/P20: caixa e envelope completo distintos.
E06	Roupeiro - retorno do canto P02	Pranchas mostram conjunto; regras preservam a caixa.
E07	Quarto - cabeceira e aéreo P04	
E08	Escritório - bancada e gaveteiro	
E09	Escritório - aéreo P17	
E10	Escritório - TV e prateleira	
E11	Sala - painel TV e prateleiras	
E12	Sala - banco P20	
NC1	Módulos - alturas livres entre planos horizontais CAD	
DT1	Detalhe-tipo - fechamento ao teto / P03	

PL1 | Planta cotada - paredes e aberturas

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

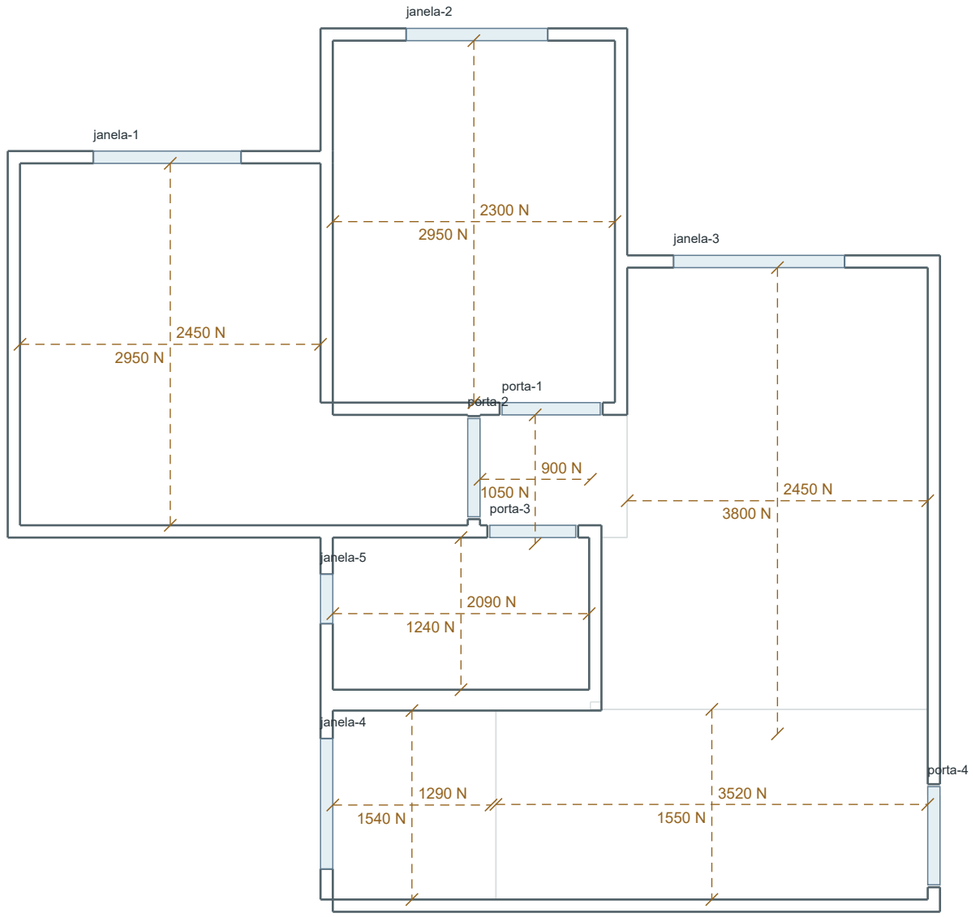

ABERTURAS - dimensões em mm

janela-1 / quarto

L: 1200 N | P: 100 N | peitoril: 920 N | H: 1130 N

janela-2 / escritorio

L: 1150 N | P: 100 N | peitoril: 920 N | H: 1130 N

janela-3 / sala

L: 1390 N | P: 100 N | peitoril: 920 N | H: 1130 N

janela-4 / lavanderia

L: 100 N | P: 1060 N | peitoril: 920 N | H: 1130 N

janela-5 / banho

L: 100 N | P: 400 N | peitoril: 920 N | H: 1130 N

porta-1 / escritorio

L: 800 N | P: 100 N | peitoril: 0 N | H: 2100 N

porta-2 / quarto

L: 100 N | P: 800 N | peitoril: 0 N | H: 2100 N

porta-3 / banho

L: 700 N | P: 100 N | peitoril: 0 N | H: 2100 N

porta-4 / cozinha

L: 100 N | P: 800 N | peitoril: 0 N | H: 2100 N

Planta: X para a direita; Y para baixo. Medidas em mm; imprimir a 100%.

Paredes e aberturas reconstituídas; conferir alinhamentos e espessuras no imóvel.

Vãos: coordenadas nominais lidas do CAD; referências históricas PR ainda por conciliar, sem alterar regras dimensionais.

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | PL1 | 20 folhas | A3 / 1:50


59 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a9026956aa4557a2fa392f4...

50 mm no papel = 2500 mm reais

PL2 | Planta de layout - envelopes CAD

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

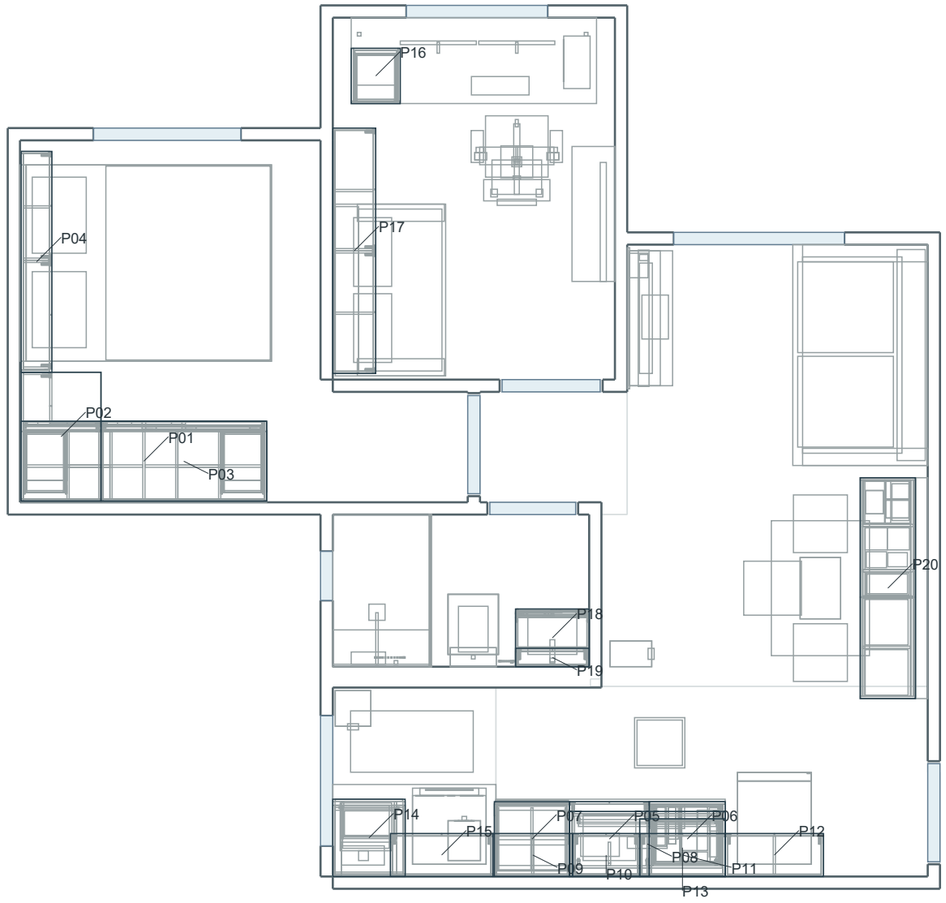

CAD: envelopes de todas as peças visíveis exportadas

P01	2000 N × 650 N × 2132 N
P02	650 N × 1050 N × 308 N
P03	1350 N × 650 N × 308 N
P04	250 N × 1800 N × 308 N
P05	650 N × 610 N × 720 N
P06	619 N × 610 N × 720 N
P07	613 N × 610 N × 900 N
P08	1269 N × 530 N × 180 N
P09	650 N × 350 N × 592 N
P10	547 N × 350 N × 1018 N
P11	697 N × 350 N × 610 N
P12	801 N × 350 N × 584 N
P13	697 N × 470 N × 18 N
P14	590 N × 630 N × 920 N
P15	835 N × 350 N × 580 N
P16	400 N × 450 N × 240 N
P17	350 N × 2000 N × 550 N
P18	600 N × 470 N × 545 N
P19	600 N × 150 N × 750 N
P20	450 N × 1800 N × 470 N

Planta: X para a direita; Y para baixo. Medidas em mm; imprimir a 100%.

Paredes e aberturas reconstituídas; conferir alinhamentos e espessuras no imóvel.

Vãos: coordenadas nominais lidas do CAD; referências históricas PR ainda por conciliar, sem alterar regras dimensionais.

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | PL2 | 20 folhas | A3 / 1:50


60 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a9026956aa4557a2fa392f4...

50 mm no papel = 2500 mm reais

PL3 | Planta de pontos R01

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

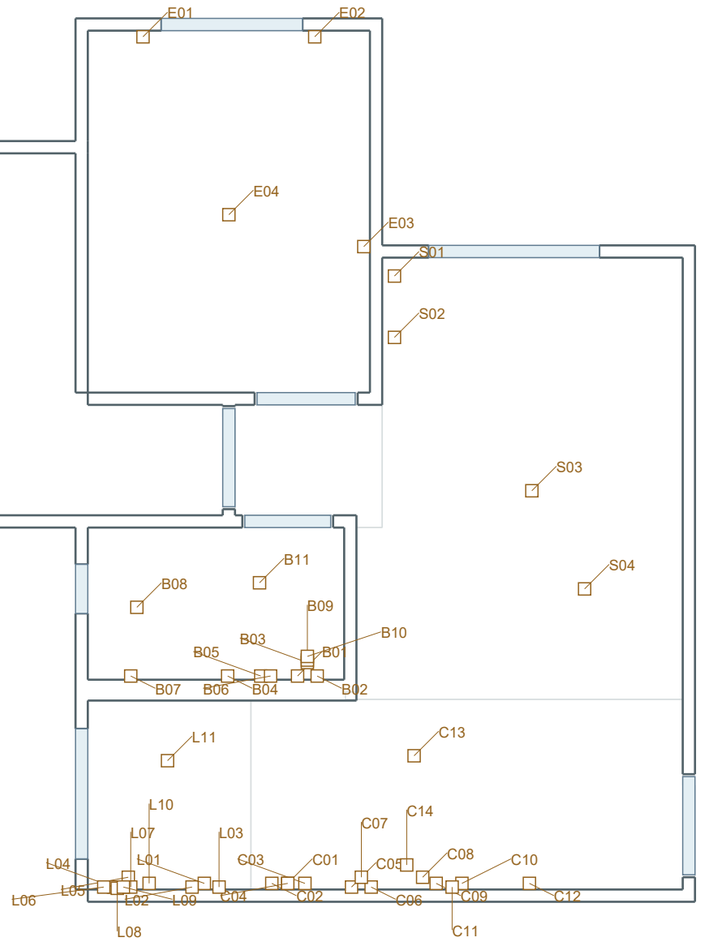

PONTOS R01 / 53 funções

Símbolos na posição nominal herdada; alturas e coordenadas nas folhas PT1/PT2.

C: cozinha; L: lavanderia; B: banheiro; S: sala; E: escritório; Q: quarto.

E06 adiada; Q06, S05 e E05 sem implantação.

Não dimensiona circuitos, tubulação ou proteção.

Conferir pontos da construtora, acessos e manutenção com RT.

Coordenadas X/Y em milímetros nos eixos desta planta.

Planta: X para a direita; Y para baixo. Medidas em mm; imprimir a 100%.

Paredes e aberturas reconstituídas; conferir alinhamentos e espessuras no imóvel.

Vãos: coordenadas nominais lidas do CAD; referências históricas PR ainda por conciliar, sem alterar regras dimensionais.
Q06: sem coordenadas R01
S05: sem coordenadas R01
E05: sem coordenadas R01
+1 avisos: ver Impacto.json

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | PL3 | 20 folhas | A3 / 1:50

98 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a9026956aa4557a2fa392f4...

50 mm no papel = 2500 mm reais

PT1 | Pontos R01 - cotas e funções / 1

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

Código / tipo	X / Y / altura (mm)			Função e condição
C01 / D	4180 N	6950 N	300 N	Forno Fischer Infinity 28349-64929 · 127 V · 2061 W
C02 / G	4050 N	6950 N	500 N	Gás GN do cooktop KE4GC
C03 / T	4320 N	6950 N	500 N	Ignição do cooktop
C04 / T	4180 N	6950 N	2000 N	Depurador DE61IX · 127 V
C05 / AF	4700 N	6980 N	550 N	Água fria da pia
C06 / AQ	4860 N	6980 N	550 N	Água quente da pia
C07 / E	4780 N	6900 N	450 N	Esgoto da pia
C08 / T20	5280 N	6900 N	920 N	Torre automática de tomadas 20 A na bancada (área seca)
C09 / T	5390 N	6950 N	1900 N	Micro-ondas ME23P · 127 V
C10 / T	5600 N	6950 N	1100 N	Purificador PE11X bivolt, uso 127 V
C11 / AF	5520 N	6980 N	1100 N	Água fria do purificador
C12 / T	6150 N	6950 N	2000 N	Geladeira IB6S bivolt, uso 127 V
C13 / L	5210 N	5910 N	2550 N	Stella EVO STH21967/30, quadrado 3000 K
C14 / A	5150 N	6800 N	1500 N	COB 3000K sob aéreos +Opus/Shelly/pulsador
L01 / T	3500 N	6950 N	1100 N	Lavadora LG VC4 CV5012PC4 · 127 V
L02 / AF	3400 N	6980 N	900 N	Água fria da lavadora
L03 / E	3620 N	6980 N	800 N	Esgoto da lavadora
L04 / AF	2760 N	6980 N	600 N	Água fria do tanque/Telca
L05 / E	2880 N	6900 N	400 N	Esgoto do tanque
L06 / G	2680 N	6980 N	1400 N	Gás GN do aquecedor Rinnai E21
L07 / T	2900 N	6980 N	1500 N	Aquecedor E21 · alimentação elétrica
L08 / X	2790 N	6990 N	2150 N	Exaustão do aquecedor E21
L09 / AQ	2840 N	6980 N	1400 N	Saída quente E21; destinos de banho/cozinha/Telca a compatibilizar
L10 / T20	3050 N	6950 N	1000 N	Tomada fixa 20 A para air fryer e cafeteira
L11 / L	3200 N	5950 N	2550 N	Firefly 9608 quadrado 3000 K
B01 / AF	4260 N	5260 N	550 N	Água fria do lavatório
B02 / AQ	4420 N	5260 N	550 N	Água quente do lavatório

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | PT1 | 20 folhas | Sem escala

81 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a9026956aa4557a2fa392f4...

PT2 | Pontos R01 - cotas e funções / 2

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

Código / tipo	X / Y / altura (mm)			Função e condição
B03 / E	4340 N	5150 N	450 N	Esgoto do lavatório
B04 / AF	3690 N	5260 N	200 N	Água fria do vaso
B05 / AF	3960 N	5260 N	600 N	Ducha higiênica · fria
B06 / AQ	4040 N	5260 N	600 N	Ducha higiênica · quente
B07 / AQ	2900 N	5260 N	1200 N	Chuveiro / misturador Livo (quente e fria)
B08 / E	2950 N	4700 N	0 N	Ralo do box
B09 / A	4340 N	5130 N	1900 N	Espelho 4000 K: Cristallux COB 2x 550 mm /13,2 W
B10 / A	4340 N	5100 N	2300 N	Indireta 3000 K: Brilia 318939 até 2 m /9,6 W
B11 / L	3950 N	4500 N	2300 N	Teto 3000 K: Galaxy Firefly 9605 /25 W /IP44
S01 / T	5050 N	2000 N	300 N	Régua no compartimento ventilado: TV, PS5, soundbar
S02 / T	5050 N	2500 N	1200 N	TV 50″ atrás do painel
S03 / L	6170 N	3750 N	2550 N	Geral smart: Jurerê +2 WiZ +WiZmote, candidata
S04 / L	6600 N	4550 N	2550 N	Jabuticaba triplo +3Brilia 314450 +D1/RM433
E01 / T	3000 N	50 N	850 N	Bancada · notebook
E02 / T	4400 N	50 N	850 N	Bancada · PC CH360, monitores
E03 / T	4800 N	1760 N	1000 N	TV 43″ existente
E04 / L	3700 N	1500 N	2550 N	Geral smart: Jurerê +2 WiZ +WiZmote, candidata
Q01 / A	50 N	1120 N	1100 N	Nordecor EVY2054 branca · lado 1
Q02 / A	50 N	2880 N	1100 N	Nordecor EVY2054 branca · lado 2
Q03 / T	50 N	1050 N	600 N	Tomada de cabeceira · lado 1
Q04 / T	50 N	2950 N	600 N	Tomada de cabeceira · lado 2
Q05 / L	1220 N	2480 N	2550 N	Geral smart Elgin 48D18WSRWIFI: brilho, Alexa/celular
Q06 / A	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE	Cabeceira/face inferior: COB 3000K +Opus/Shelly
S05 / A	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE	TV sala: COB3000K +Opus/Shelly/pulsador
E05 / A	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE	TV escritório: kit WiZ2m e WiZmote próprio
E06 / A	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE	E06 ADIADO: prateleiras escritório, fase futura

Q06-X: a levantar
Q06-Y: a levantar
Q06-Z: a levantar
S05-X: a levantar
+8 avisos: ver Impacto.json

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR


R02 | PT2 | 20 folhas | Sem escala

66 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a9026956aa4557a2fa392f4...

E01 | Cozinha - face da bancada e aéreos

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

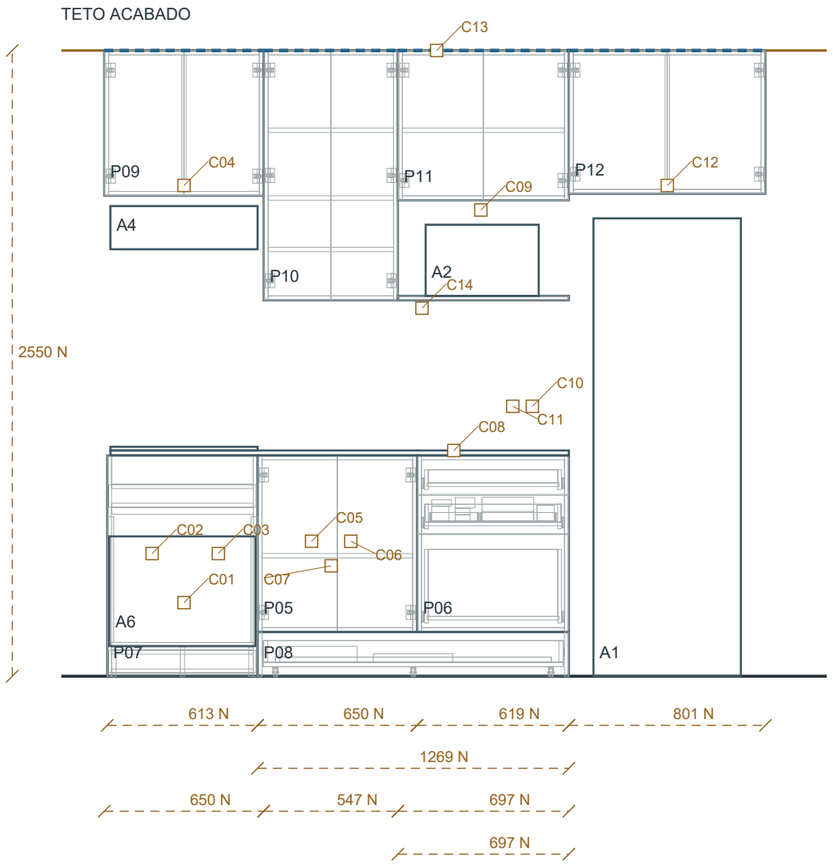

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P05	650 N	180 N	900 N	1650 N
P06	619 N	180 N	900 N	1650 N
P07	613 N	0 N	900 N	1650 N
P08	1269 N	0 N	180 N	2370 N
P09	650 N	1958 N	2550 N	0 N
P10	547 N	1532 N	2550 N	0 N
P11	697 N	1940 N	2550 N	0 N
P12	801 N	1966 N	2550 N	0 N
P13	697 N	1532 N	1550 N	1000 N
A1	601 N	0 N	1866 N	684 N
A2	461 N	1550 N	1840 N	710 N
A3	600 N	920 N	935 N	1615 N
A4	600 N	1740 N	1916 N	634 N
A5	1869 N	900 N	920 N	1630 N
A6	595 N	123 N	570 N	1980 N

P09 H estudo = 592 N; base fixa / topo segue PD

P10 H estudo = 1018 N; base fixa / topo segue PD

P11 H estudo = 610 N; base fixa / topo segue PD

P12 H estudo = 584 N; base fixa / topo segue PD

A1: Geladeira IB6S — aparencia e portas

A2: Micro-ondas Electrolux ME23P

A3: Cozinha_Cooktop_Electrolux_KE4GC_134

A4: Cozinha_Depurador_Suggar_DE61IX_139

A5: Cozinha_Bancada_cozinha_reserva_de_recortes_308

A6: Fischer · Frente · envelope

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

C01 300 N	C02 500 N	C03 500 N
C04 2000 N	C05 550 N	C06 550 N
C07 450 N	C08 920 N	C09 1900 N
C10 1100 N	C11 1100 N	C12 2000 N
C13 2550 N	C14 1500 N	

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E01 | 20 folhas | A3 / 1:25

106 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a9026956aa4557a2fa392f4...


50 mm no papel = 1250 mm reais

E02 | Cozinha - face oposta / interface da lixeira

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

A1	340 N	0 N	450 N	2100 N
A2	340 N	450 N	470 N	2080 N

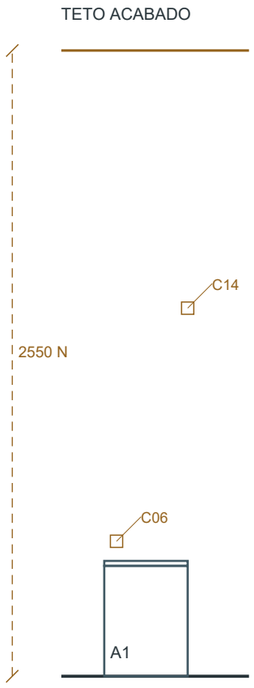

A face oposta não contém módulo de marcenaria na CAD.

Mostra a interface nominal da lixeira junto ao banheiro.

A1: Cozinha_Lixeira_comum_Biovis_Coleta_15_L_144

A2: Cozinha_Lixeira_comum_Biovis_Coleta_15_L001_145

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

C01 300 N	C02 500 N	C03 500 N
C04 2000 N	C05 550 N	C06 550 N
C07 450 N	C08 920 N	C09 1900 N
C10 1100 N	C11 1100 N	C12 2000 N
C13 2550 N	C14 1500 N	

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E02 | 20 folhas | A3 / 1:25


37 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a9026956aa4557a2fa392f4...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E03 | Lavanderia - tanque, cesto e aéreo

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

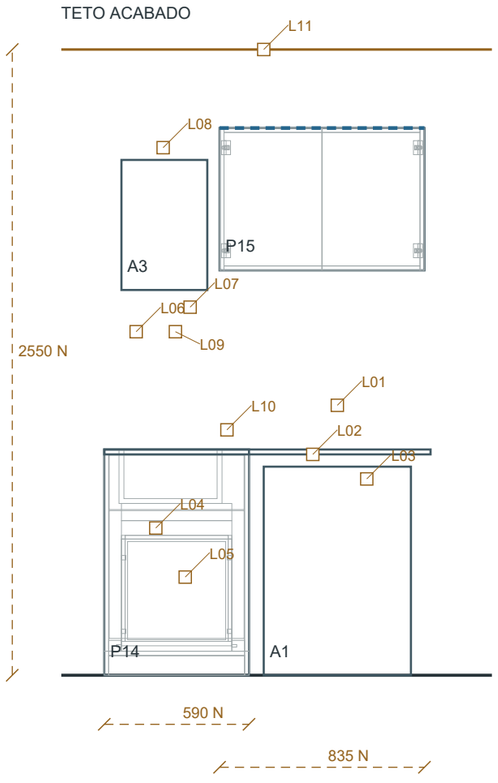

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P14	590 N	0 N	920 N	1630 N
P15	835 N	1650 N	2230 N	320 N
A1	600 N	0 N	850 N	1700 N
A2	1330 N	900 N	920 N	1630 N
A3	350 N	1570 N	2100 N	450 N

P15 H estudo = 580 N; base fixa / topo segue PD

A1: Lava e seca LG VC4 — aparencia e porta

A2: Lavanderia_Bancada_lavanderia_tanque_a_recortar_357

A3: Lavanderia_Rinnai_E21_GN_REU_E211_FEH_155

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

L01 1100 N	L02 900 N	L03 800 N
L04 600 N	L05 400 N	L06 1400 N
L07 1500 N	L08 2150 N	L09 1400 N
L10 1000 N	L11 2550 N	

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E03 | 20 folhas | A3 / 1:25


47 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a9026956aa4557a2fa392f4...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E04 | Banheiro - gabinete, bancada e espelho

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

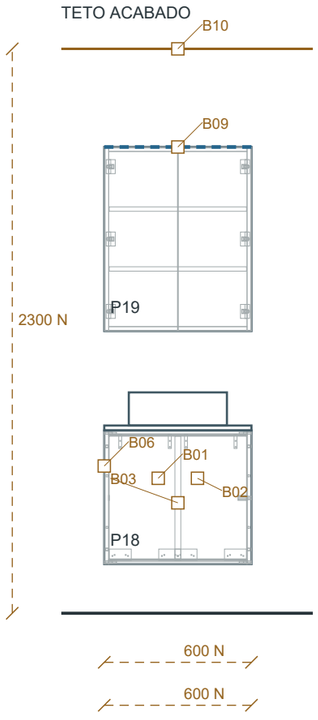

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P18	600 N	200 N	745 N	1555 N
P19	600 N	1150 N	1900 N	400 N
A1	600 N	745 N	765 N	1535 N
A2	400 N	765 N	900 N	1400 N

P19 H estudo = 750 N; base fixa / topo segue PD

A1: Banho_Bancada_banheiro_cuba_a_recortar_399

A2: Banho_Cuba_Deca_Slim_branca_L_13040_17_185

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

B01 550 N	B02 550 N	B03 450 N
B04 200 N	B05 600 N	B06 600 N
B07 1200 N	B08 0 N	B09 1900 N
B10 2300 N	B11 2300 N	

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E04 | 20 folhas | A3 / 1:25


43 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a9026956aa4557a2fa392f4...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E05 | Roupeiro - P01-P03 e maleiro / face principal

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

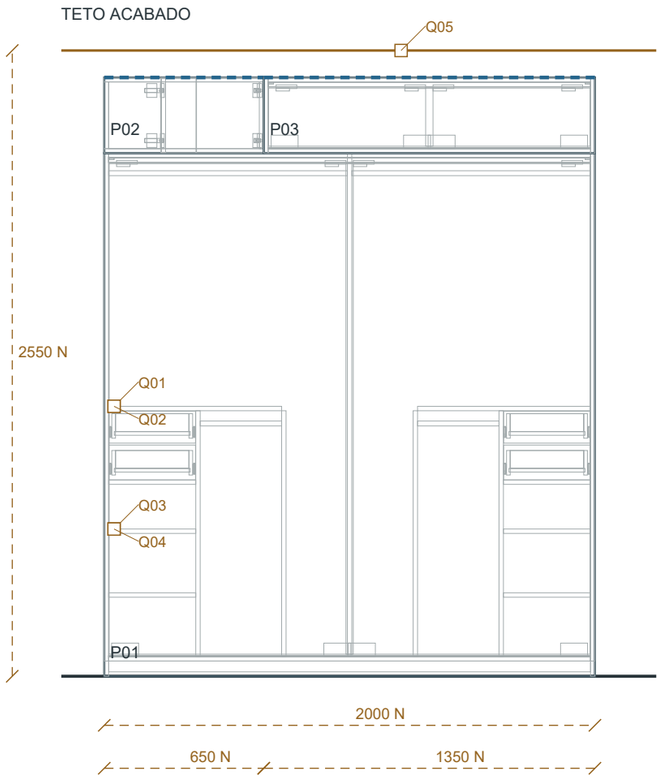

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

Q06-altura: a levantar

Q06-posicao-x: a levantar

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P01	2000 N	0 N	2132 N	418 N
P02	650 N	2132 N	2440 N	110 N
P03	1350 N	2132 N	2440 N	110 N

P02 H estudo = 308 N; base fixa / topo segue PD

P03 H estudo = 308 N; base fixa / topo segue PD

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

Q01 1100 N	Q02 1100 N	Q03 600 N
Q04 600 N	Q05 2550 N	Q06 PENDENTE

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E05 | 20 folhas | A3 / 1:25


30 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a9026956aa4557a2fa392f4...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E06 | Roupeiro - retorno do canto P02

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

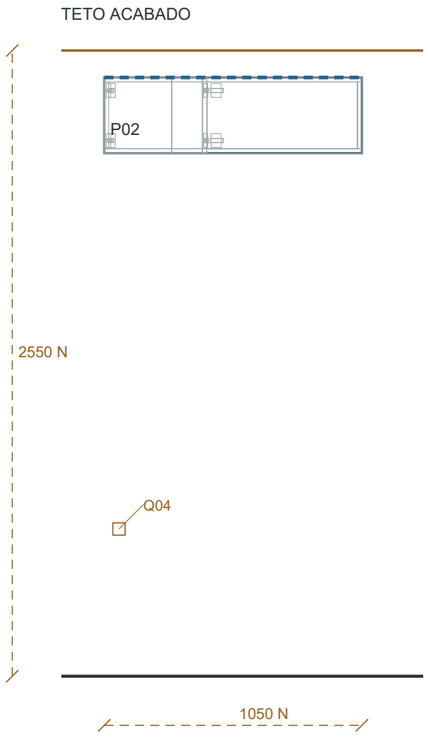

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P02	1050 N	2132 N	2440 N	110 N

P02 H estudo = 308 N; base fixa / topo segue PD

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

Q01 1100 N	Q02 1100 N	Q03 600 N
Q04 600 N	Q05 2550 N	Q06 PENDENTE

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

Q06-altura: a levantar
Q06-posicao-y: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E06 | 20 folhas | A3 / 1:25


18 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a9026956aa4557a2fa392f4...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E07 | Quarto - cabeceira e aéreo P04

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

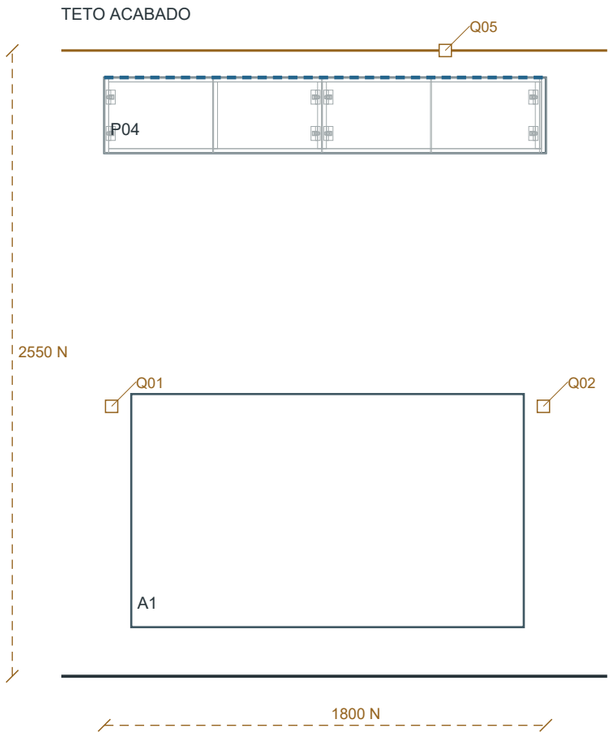

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO				
P04	1800 N	2132 N	2440 N	110 N
A1	1600 N	200 N	1150 N	1400 N

P04 H estudo = 308 N; base fixa / topo segue PD

A1: Cabeceira estofada — dois painéis aprovados / envelope de estudo

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

Q01 1100 N	Q02 1100 N	Q03 600 N
Q04 600 N	Q05 2550 N	Q06 PENDENTE

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

Q06-altura: a levantar
Q06-posicao-y: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E07 | 20 folhas | A3 / 1:25


22 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a9026956aa4557a2fa392f4...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E08 | Escritório - bancada e gaveteiro

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

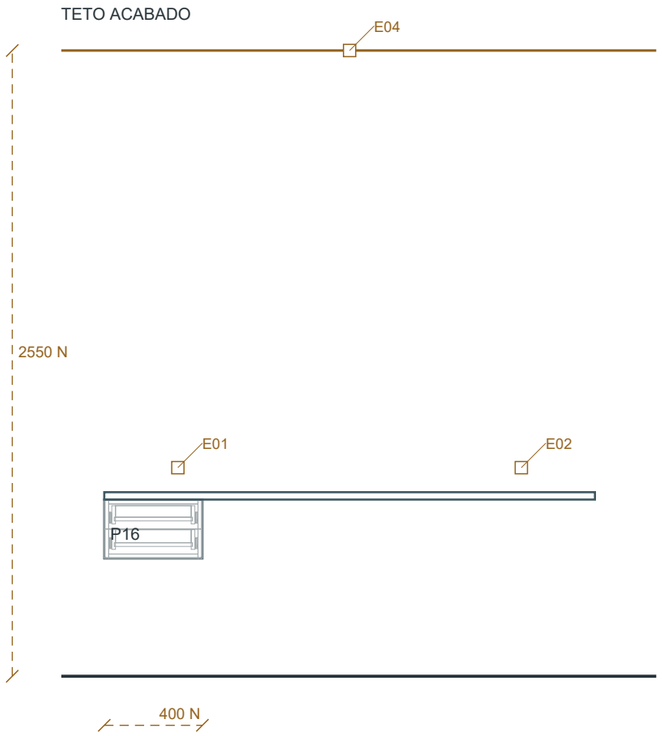

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P16	400 N	480 N	720 N	1830 N
A1	2000 N	720 N	750 N	1800 N

A1: Escritorio_Bancada_de_trabalho_110

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

E01 850 N	E02 850 N	E03 1000 N
E04 2550 N	E05 PENDENTE	E06 PENDENTE

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

E05-altura: a levantar
E05-posicao-x: a levantar
E06-altura: a levantar
E06-posicao-x: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E08 | 20 folhas | A3 / 1:25


18 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a9026956aa4557a2fa392f4...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E09 | Escritório - aéreo P17

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

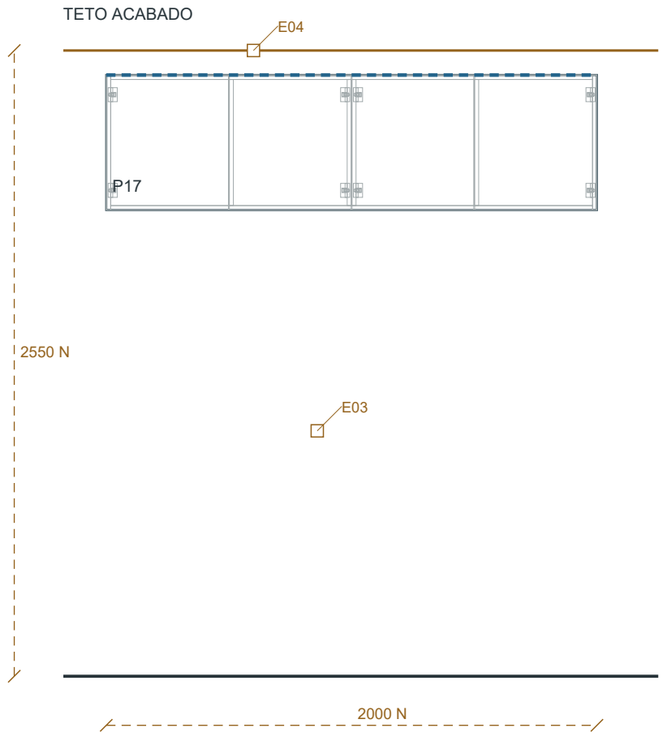

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P17	2000 N	1900 N	2450 N	100 N

P17 H estudo = 550 N; base fixa / topo segue PD

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

E01 850 N	E02 850 N	E03 1000 N
E04 2550 N	E05 PENDENTE	E06 PENDENTE

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

E05-altura: a levantar
E05-posicao-y: a levantar
E06-altura: a levantar
E06-posicao-y: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E09 | 20 folhas | A3 / 1:25


16 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a9026956aa4557a2fa392f4...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E10 | Escritório - TV e prateleira

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

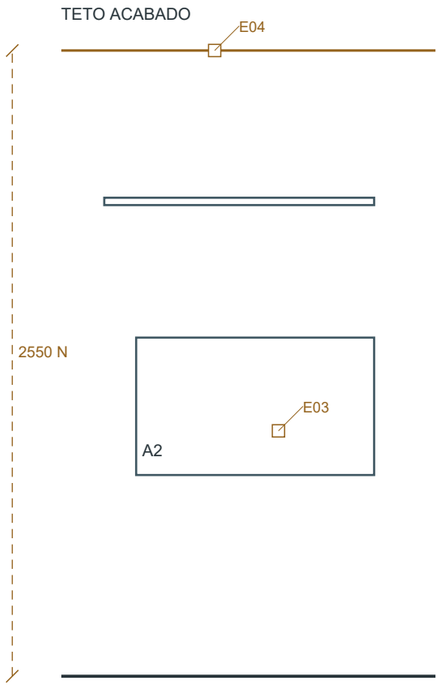

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

A1	1100 N	1920 N	1950 N	600 N
A2	970 N	820 N	1380 N	1170 N

A1: Escritorio_Prateleira_alta_dos_consoles_130

A2: Escritorio_Samsung_43_existente_131

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

E01 850 N	E02 850 N	E03 1000 N
E04 2550 N	E05 PENDENTE	E06 PENDENTE

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

E05-altura: a levantar
E05-posicao-y: a levantar
E06-altura: a levantar
E06-posicao-y: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E10 | 20 folhas | A3 / 1:25


17 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a9026956aa4557a2fa392f4...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E11 | Sala - painel TV e prateleiras

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

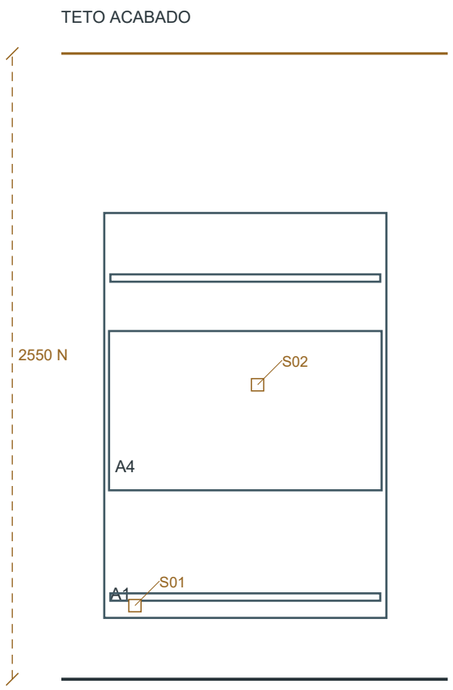

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

A1	1150 N	250 N	1900 N	650 N
A2	1100 N	320 N	350 N	2200 N
A3	1100 N	1620 N	1650 N	900 N
A4	1111 N	770 N	1419 N	1131 N

A1: Sala_Painel_liso_da_TV_084
A2: Sala_Uma_prateleira_acima_e_outra_abaixo_da_TV_085
A3: Sala_Uma_prateleira_acima_e_outra_abaixo_da_TV001_086
A4: Sala_TV_50_preferencia_Ambilight_088

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

S01 300 N	S02 1200 N	S03 2550 N
S04 2550 N	S05 PENDENTE	

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

S05-altura: a levantar
S05-posicao-y: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E11 | 20 folhas | A3 / 1:25


25 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a9026956aa4557a2fa392f4...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E12 | Sala - banco P20

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

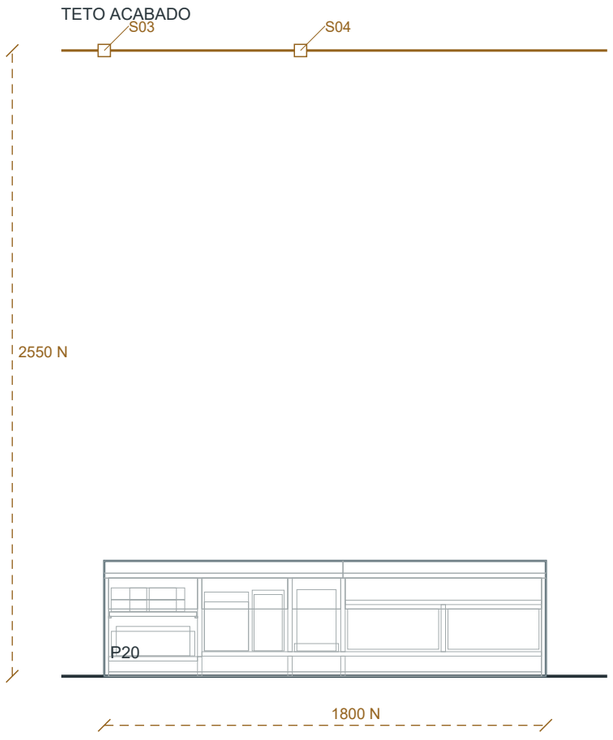

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P20	1800 N	0 N	470 N	2080 N

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

S01 300 N	S02 1200 N	S03 2550 N
S04 2550 N	S05 PENDENTE	

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

S05-altura: a levantar
S05-posicao-y: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E12 | 20 folhas | A3 / 1:25

14 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a9026956aa4557a2fa392f4...

50 mm no papel = 1250 mm reais

NC1 | Módulos - alturas livres entre planos horizontais CAD

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

Módulo	Vãos verticais entre envelopes / de baixo para cima / mm
P01	Sem par de planos horizontais identificável no envelope.
P02	272 N
P03	272 N
P04	272 N
P05	284 N
P06	31 N / 369 N / 141 N
P07	Sem par de planos horizontais identificável no envelope.
P08	Sem par de planos horizontais identificável no envelope.
P09	556 N
P10	180 N / 192 N / 258 N / 298 N
P11	258 N / 298 N
P12	548 N
P13	Sem par de planos horizontais identificável no envelope.
P14	532 N
P15	544 N
P16	31 N / 89 N / 54 N
P17	514 N
P18	Sem par de planos horizontais identificável no envelope.
P19	226 N / 226 N / 226 N
P20	300 N

Triagem geométrica: planos que cobrem ao menos metade da largura e profundidade do módulo.

Não confirma vão útil de porta, gaveta, recorte ou ferragem; conferir peça específica antes de executar.

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR


R02 | NC1 | 20 folhas | Sem escala

25 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a9026956aa4557a2fa392f4...

DT1 | Detalhe-tipo - fechamento ao teto / P03

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

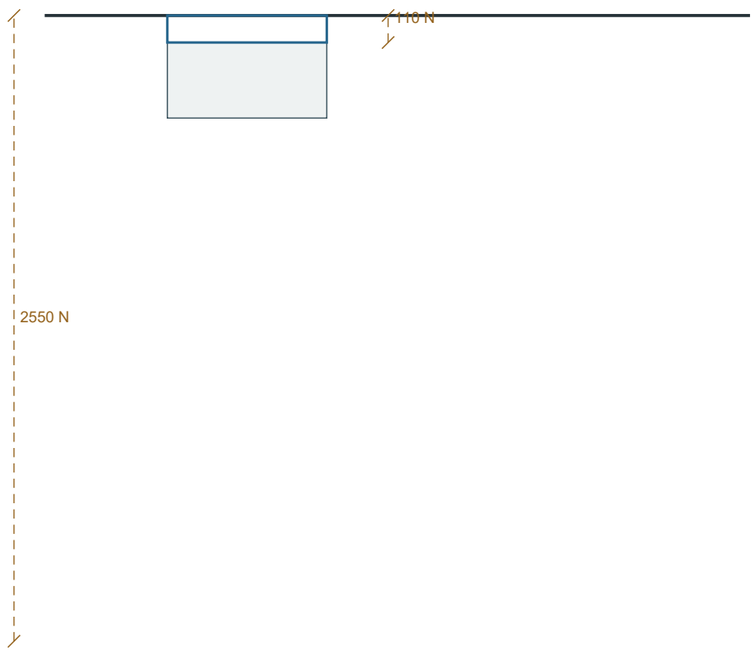

Altura do fechamento = PD efetivo - topo da caixa CAD

Resultado: 110 N

Envelope de estudo; espessura, juntas e acesso de montagem com oficina/RT.

Não representa nova peça incorporada ao FCStd.

Não reduzir automaticamente peças existentes para ocultar conflito.

P03 e aéreos: altura de estudo = PD - folga nominal - base CAD.

Conferir teto em vários pontos; usar altura livre limitante no CSV.

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | DT1 | 20 folhas | A3 / 1:25

2 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a9026956aa4557a2fa392f4...

50 mm no papel = 1250 mm reais
