Guedala Park

Caderno para revisão do arquiteto

Anteprojeto | emissão 01/11/2026 | não enviado

Estudo nominal. Não executar. Medidas acabadas, compatibilização profissional e detalhamento executivo pendentes.

Componente	Referência e limite
Modelo FreeCAD	R55 vigente, arquivo incluído sem alteração.
Pranchas no anexo	R02, referência dos desenhos R54; 20 folhas A3 preservadas em tamanho original. Não são nova extração arquitetônica do R55.
Pontos	R01: 53 funções, E06 adiada; posições e circuitos por compatibilizar.
Materiais	Caderno R01: intenções de projeto; amostras, SKUs e produtos pendentes.
Revisão	13 questões da base arquitetônica + 10 interfaces prioritárias.
Levantamento	532 registros de preparação, nenhum valor medido preenchido.

Solicitação ao arquiteto

Confirmar o escopo de levantamento e revisão; conciliar níveis, paredes/vãos e áreas; definir as interfaces de instalações e manutenção; indicar o formato editável necessário e as disciplinas/RT responsáveis.

Intercâmbio: FCStd nativo disponível. IFC/DWG/DXF/STEP não exportados; escolher formato e finalidade com o destinatário antes da conversão.

SHA256 do CAD: d5ed97df437b24c782f3b052739604d86e0cca3d14266d7fe396123c51058297

Layout de referência

Planta mobiliada R03, cena R54; representação visual anterior ao R55. A vista inclui apresentações de acabamento do site, inclusive verde na janela do box, que segue candidato separado no CAD. Sem escala.



Imagem ilustrativa · sem cotas · medidas a conferir

Geometria R54 · cores aproximadas

Comparação de níveis

Referência	Demais ambientes	Banheiro
Piso no CAD	Z = 0 mm	Z = 0 mm
Topo da envoltória R55	2570 mm	2570 mm
Teto acabado de projeto	2600 mm nominal	2500 mm nominal
Envoltória menos projeto	-30 mm	+70 mm
Composição de piso no CAD	Z -50 a 0 mm, representação nominal	Z -50 a 0 mm, representação nominal

Quadro comparativo sem escala, não é corte construtivo. Forro não modelado; espessura gráfica de piso não comprova composição. Medir piso/teto acabados e desníveis antes de ajustar a envoltória ou os fechamentos dos armários. ARQ-01/11/12.

Materiais e acabamentos

Extrato da seção 1 do Caderno de especificações R01. A fonte completa acompanha o pacote. Mesma chapa física: mesmo acabamento nas duas faces; peças distintas exigem identificação e compatibilização. Amostras e códigos comerciais ainda condicionados.

Material	Ambientes	Situação	Observação
Estofado claro · cadeiras Lina	Sala + jantar	Referência aprovada	Composição clara com estrutura amadeirada.
Branco TX · interiores	Sala + jantar, Quarto, Escritório, Cozinha, Lavanderia, Banheiro	Escolhido	Faces internas identificadas nas fichas.
Espelho · frente do espelheiro	Banheiro	Escolhido	Representação clara do espelho, sem simulação de reflexos.
Greenplac Arenza	Cozinha, Escritório, Lavanderia, Sala + jantar, Quarto	Escolhido / referência	Escolhido na cozinha/escritório e testeira.
Guararapes Azul Petróleo	Cozinha	Escolhido	Armários superiores contínuos da geladeira ao cooktop.
Duratex Azul Profundo	Cozinha	Alternativa	Alternativa de chapa à cor principal, ainda não escolhida.
Granito Branco Itaúnas	Cozinha, Lavanderia, Banheiro	Escolhido	Pedra natural. Padrão e cor variam por lote.
Algodão Egípcio	Sala + jantar, Quarto, Escritório, Cozinha, Lavanderia, Banheiro	Escolhido	Na cozinha e lavanderia, acabamento fosco com resistência à limpeza escolhido.
Off-white fosco	Sala + jantar, Escritório, Quarto	Escolha para o projeto	Frentes lisas e claras.
Inox Look	Cozinha, Lavanderia	Escolhido	Acabamento escolhido para IB6S e LG VC4.
Bouclê bege-claro · Bonnie	Sala + jantar	Escolhido	Modelo e versão de referência escolhidos.
Cinza-claro · Daiane	Escritório	Escolhido	Cinza-claro aprovado.
Bege / greige estofado	Quarto, Sala + jantar	Proposta a conferir	Cabeceira clara aprovada como composição.
Portobello Vivant Sauge Mate	Banheiro	Escolhido	RB-01 · 7 × 24,4 cm · paredes focais do box (fundo e janela, 30/10/2026).
Travertino Reale Greige	Banheiro	Escolhido	Biancogres PB-01 Satin 90 × 90 cm.
Eliane Iseo Marfim AC	Lavanderia	Escolhido	PL-01 · 90 × 90 cm. Entrega cerâmica.
Preto / grafite	Todos	Escolhido	Metais, pedestal, eletrônicos e detalhes.
Tarkett Ambienta Design Olmo · 24192727	Sala + jantar, Quarto, Escritório, Cozinha	Opção preferida	Vinílico em toda a casa, exceto banheiro/lavanderia.
Arauco Beige Matt · banheiro	Banheiro	Escolhido	Frentes fechadas e foscas, sem ripado nem puxadores salientes.
Arauco Louro Freijó Poro · laterais do banheiro	Banheiro	Escolhido	Laterais aparentes do gabinete e do armário com espelho.

Base arquitetônica: 13 questões

Revisão documental concluída em 01/11/2026; fechamento físico/técnico pendente. IDs correspondem aos CSV incluídos, com fontes e critérios completos.

ARQ-01 | Níveis e teto

R55: Nivel_Parametros e sete Area_* registram 2570 mm. CSV: 2600 mm nos seis ambientes e 2500 mm no banheiro; diferenças -30/+70 mm. Forro não modelado.

Encaminhamento: Qual a distância do piso acabado ao teto acabado em cada trecho? Há forro ou desnível?

Responsável: Arquiteto/levantamento/RT. Critério completo no CSV, ID ARQ-01.

ARQ-02 | Paredes

Envoltória com paredes de 100 mm nominais; contornos PR-WALLS reconstruídos, sem medidas reais.

Encaminhamento: Quais as faces acabadas, espessuras, prumos e esquadros reais? Quais panos são compartilhados?

Responsável: Arquiteto/levantamento/RT. Critério completo no CSV, ID ARQ-02.

ARQ-03 | Porta de entrada

Porta_Entrada.Largura_Vao = 750 mm; propriedade Divergencia registra folha antiga 850 mm e desencontro de implantação. Altura_Vao = 2050 mm nominal.

Encaminhamento: Quais as posições, largura/altura do vão, folha, batente, guarnição e sentido de abertura reais?

Responsável: Arquiteto/levantamento. Critério completo no CSV, ID ARQ-03.

ARQ-04 | Janelas

Tabela do CAD usa peitoril/envoltória 920/1130 mm; registros PR-JANELA usam vidro Z950/H1100. Diferença inclui soleira de 30 mm; são grandezas distintas.

Encaminhamento: Quais os vãos brutos e acabados, peitoris, marcos e limites do vidro?

Responsável: Arquiteto/levantamento. Critério completo no CSV, ID ARQ-04.

ARQ-05 | Portas internas e pranchas

PR-PORTA guarda envelopes anteriores de folhas e posições, não levantamento do vão bruto com batentes; novas esquadrias estão no R55.

Encaminhamento: Onde começam e terminam os vãos e qual a passagem útil após batente e acabamento?

Responsável: Arquiteto/levantamento. Critério completo no CSV, ID ARQ-05.

ARQ-06 | Quadro de áreas

CAD 35,8530 m² versus H01 35,4583 m²; delta +0,3947 m². QuadroAreas registra soleiras, passagens e divisão sala/cozinha. Área privativa 40,18 m² usa outro critério.

Encaminhamento: Que contorno e regra de atribuição de soleiras/passagens serão usados no quadro de piso e orçamento?

Responsável: Arquiteto; quantitativos após decisão. Critério completo no CSV, ID ARQ-06.

ARQ-07 | Lavanderia

CAD 1290 × 1610 mm mais transição 0,0644 m²; documento 1290 × 1540 mm. Área CAD 2,1413 versus H01 1,9866 m².

Encaminhamento: Qual a distância transversal entre faces acabadas e onde termina a transição para cozinha?

Responsável: Arquiteto/levantamento. Critério completo no CSV, ID ARQ-07.

ARQ-08 | Folgas negativas

Quatro valores: P07 X/início -13 mm; P09 X/início -25 mm; P15 X/fim -15 mm; Peca357 X/fim -40 mm. Todos sem parede física identificada no CSV.

Encaminhamento: Esses limites são paredes reais, panos abertos ou divisões do retângulo de referência? A que elemento corresponde Peca357 em campo?

Responsável: Arquiteto/levantamento. Critério completo no CSV, ID ARQ-08.

ARQ-09 | Folgas de montagem

34 folgas ≤15 mm na base anterior: 4 negativas, 24 nulas e 6 positivas de 10 mm. Proposta de 10 mm com arremate não foi adotada.

Encaminhamento: Em quais lados existe parede e qual folga/arremate será aceito após levantamento?

Responsável: Elias decide aparência; arquiteto/oficina definem montagem. Critério completo no CSV, ID ARQ-09.

ARQ-10 | Datum e coordenadas

CSV PR usa X espelhado pelo PR-EIXO-X nominal de 7400 mm. Gerador converte caixa X para [eixo-Xmax,eixo-Xmin]. M0/M1 não têm vínculo físico demonstrado.

Encaminhamento: Quais marcos físicos definem origem, direção e transformação entre levantamento, CAD e planta?

Responsável: Arquiteto/levantamento. Critério completo no CSV, ID ARQ-10.

ARQ-11 | Encontro com teto

Armários até o teto são diretriz de 26/10/2026; fechamentos e interfaces permanecem nominais. Modelo não define teto acabado nem tolerância de montagem.

Encaminhamento: Como executar fechamento e acesso de montagem/manutenção diante do teto real?

Responsável: Arquiteto/oficina; Elias para aparência. Critério completo no CSV, ID ARQ-11.

ARQ-12 | Soleiras e rodapés

Pisos/soleiras desenhados em Z -50..0 mm; espessura é representação nominal, não composição construtiva comprovada. Rodapé nominal 80 × 15 mm, com cortes nos batentes.

Encaminhamento: Quais camadas, espessuras, transições e produtos serão usados? Como tratar a transição sob a porta do banheiro?

Responsável: Arquiteto/RT/oficina. Critério completo no CSV, ID ARQ-12.

ARQ-13 | Representação arquitetônica

Pranchas R02 mantêm referência R54; metadados dos envelopes vinculados ao R55 sem reexportação. Exportador depende da árvore antiga.

Encaminhamento: Como exportar a árvore atual sem perder módulos nem duplicar formas e compatibilizar vãos/contornos?

Responsável: Projeto/autor do exportador; arquiteto revisa. Critério completo no CSV, ID ARQ-13.

Instalações e manutenção: 10 interfaces

Revisão documental concluída em 01/11/2026; fechamento físico/técnico pendente. IDs correspondem aos CSV incluídos, com fontes e critérios completos.

INT-01 | Cozinha/lavanderia

Cocção × lavadora: painel isolante LG e percurso de ventilação/retirada do Fischer ainda condicionados.

Encaminhamento: Conferir em um corte conjunto painel isolante 850 × 600 com alumínio, apoios, entradas/saídas de ar, grelhas removíveis e retirada dos aparelhos; MDF 18 não demonstrado equivalente.

Responsável: Arquiteto/oficina; RT valida instalação. Critério completo no CSV, ID INT-01.

INT-02 | Cozinha

Micro-ondas: 10 cm desejados acima versus 30 cm do manual, conforme divergência já registrada.

Encaminhamento: Submeter nicho/equipamento à solução técnica antes de fechar marcenaria; preservar a exigência registrada do manual até comprovação aplicável.

Responsável: Arquiteto/RT; Elias decide eventual mudança de layout/produto. Critério completo no CSV, ID INT-02.

INT-03 | Lavanderia

E21 × varal: arranjo lateral não cabe no trecho nominal ensaiado; terminal, ventilação permanente, registros e acessos não implantados.

Encaminhamento: Localizar saídas e infraestrutura entregues; desenhar E21, duto/terminal, ventilação, acesso aos registros e percurso do varal com roupa na mesma elevação. Não usar depurador como substituto da exaustão do E21.

Responsável: Arquiteto/RT/construtora; instalador de gás. Critério completo no CSV, ID INT-03.

INT-04 | Cozinha/lavanderia/banheiro

Água quente: C06 não confirmada; entrada quente da Telca não representada por código próprio; rotas da pia/ducha do banheiro não escolhidas.

Encaminhamento: Levantar alimentações e derivação privativa; definir esquema quente/fria e acessos, incluindo Telca. Conferir vazão/pressão dos produtos e funcionamento individual dos pontos antes de escolher rota; não repetir simulação nominal.

Responsável: Arquiteto/RT; fornecedores dos metais. Critério completo no CSV, ID INT-04.

INT-05 | Cozinha/lavanderia

Conexões podem disputar espaço com cesto P14, sifão, contrapeso Telca e armários; retirada de aparelhos permanece pendente.

Encaminhamento: Conferir cesto em movimento e retirada do saco, sifão/engates, mangueira/contrapeso, tomadas e retirada de lavadora, purificador e geladeira. Usar nível de pedra 920 mm como diretriz, a compatibilizar.

Responsável: Arquiteto/oficina/instalador após levantamento. Critério completo no CSV, ID INT-05.

INT-06 | Banheiro

BC43 × porta/vaso × Arion/espelheiro: percurso removível e folgas nominais não comprovam acesso real.

Encaminhamento: Conferir porta/maçaneta, retirada do quadro, acesso aos M6/sifão e envelope da alavanca Arion com portas do espelheiro e barra de luz. Manter torneira centralizada atrás da cuba.

Responsável: Arquiteto/oficina; fornecedor do metal. Critério completo no CSV, ID INT-06.

INT-07 | Banheiro

Água, luz e box até o teto precisam compartilhar cortes sem bloquear acesso ou presumir proteção elétrica pelo vidro.

Encaminhamento: Demarcar posições de ducha/misturador, perfis/fontes e três comandos; RT define proteção, volumes e percursos próprios. Conferir fixação/vedação do box com teto real.

Responsável: Arquiteto/RT/instaladores. Critério completo no CSV, ID INT-07.

INT-08 | Cozinha/lavanderia

Luz × portas/varal: centros e altura de 150 cm da bancada são nominais; fonte/perfil ainda sem implantação final.

Encaminhamento: Marcar luminárias fora do giro dos armários e conferir sombra com roupa; detalhar fonte acessível da bancada e comando. Manter geral de cozinha/lavanderia com interruptor comum.

Responsável: Arquiteto/instalador; fornecedores IL04-IL07. Critério completo no CSV, ID INT-08.

INT-09 | Sala/quarto/escritório

S05/Q06/E05 sem coordenadas; E06 adiada. E05 deve ter suporte independente de P17; Elgin ainda depende de manual/comando físico.

Encaminhamento: Implantar as três indiretas com acesso às fontes; Q06 na cabeceira/face inferior acessível, sem fresta fictícia sobre armário. Preservar E06 adiada e grupos separados; fechar consultas IL02-IL09, sem selecionar substitutos nesta revisão.

Responsável: Arquiteto/instalador; fornecedores. Critério completo no CSV, ID INT-09.

INT-10 | Todos

Quadro/circuitos e posições entregues não levantados; contagem de funções não comprova tomadas, circuitos nem simultaneidade.

Encaminhamento: Conferir quadro, alimentação, tomadas/retornos e acessibilidade com mobiliário; RT fecha cargas/circuitos e proteção. Preservar 127 V de uso e conferir infraestrutura específica do ar-condicionado.

Responsável: RT/eletricista; arquiteto compatibiliza. Critério completo no CSV, ID INT-10.

Levantamento: datum e prioridades

O roteiro completo e o índice CSV de medidas acompanham o pacote. Esta folha resume a preparação; não substitui as descrições físicas pendentes.

1. Identificar M0 junto à entrada, M1 e direção da fachada em croqui/fotos; demonstrar vínculo com o referencial da planta antes de converter PR-X/Y.

2. Medir faces acabadas na linha a 1000 mm do piso, alturas e desníveis; identificar faces, instrumento e evidências. Janela: largura/altura livre e peitoril em três posições.

3. PR-EIXO-X = 7400 mm é referência nominal de espelhamento, não dimensão de campo comprovada. Registrar transformação, reflexão quando aplicável e ponto de conferência.

4. Campos sem medida permanecem vazios. Não usar zero, médias ou aparência do vídeo como medição da unidade.

15 prioridades do roteiro vigente

Ordem	Face ou pendência de identificação	Registro
1	Face acabada da parede atrás da bancada da cozinha e do tanque; marcar extremos do pano junto à cozinha e lavanderia.	Leitura/foto: _____
2	Face acabada da parede atrás da bancada da cozinha e do tanque; marcar extremos do pano junto à cozinha e lavanderia.	Leitura/foto: _____
3	Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui.	Leitura/foto: _____
4	Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui.	Leitura/foto: _____
5	Face acabada da parede da cabeceira e aéreo P04 no quarto; marcar os dois extremos do pano no croqui.	Leitura/foto: _____
6	Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui.	Leitura/foto: _____
7	Face acabada da parede da cabeceira e aéreo P04 no quarto; marcar os dois extremos do pano no croqui.	Leitura/foto: _____
8	Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui.	Leitura/foto: _____
9	Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui.	Leitura/foto: _____
10	Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui.	Leitura/foto: _____
11	Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui.	Leitura/foto: _____
12	Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui.	Leitura/foto: _____
13	Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui.	Leitura/foto: _____
14	Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui.	Leitura/foto: _____
15	Descrição pendente: identificar os dois extremos do pano acabado e datum M0 no croqui.	Leitura/foto: _____

Pranchas de referência: R02 / desenhos R54

As 20 folhas seguintes foram anexadas sem redimensionar. Plantas 1:50; elevações/detalhe 1:25. Imprimir A3 a 100%, sem ajustar ao papel; conferir a barra de 50 mm.

Incluem PL1-PL3 (paredes, layout e pontos), PT1-PT2 (pontos), E01-E12 (elevações), NC1 (triagem nominal de vãos) e DT1 (fechamento ao teto).

A atualização de caminho/SHA dos envelopes para R55 não reexportou a arquitetura. Paredes, vãos, pisos e esquadrias precisam ser reconciliados antes de uma emissão executiva. Não trocar o rótulo das folhas para sugerir atualização geométrica.

As 23 questões anteriores e as fontes no ZIP são o complemento da revisão. O pacote está preparado para consulta ao arquiteto; não foi enviado e não comprova compatibilização física.

CADERNO A3 | R02

PL1 Planta cotada - paredes e aberturas

PL2 Planta de layout - envelopes CAD

PL3 Planta de pontos R01

PT1 Pontos R01 - cotas e funções / 1

PT2 Pontos R01 - cotas e funções / 2

E01 Cozinha - face da bancada e aéreos

E02 Cozinha - face oposta / interface da lixeira

E03 Lavanderia - tanque, cesto e aéreo

E04 Banheiro - gabinete, bancada e espelho

E05 Roupeiro - P01-P03 e maleiro / face principal

E06 Roupeiro - retorno do canto P02

E07 Quarto - cabeceira e aéreo P04

E08 Escritório - bancada e gaveteiro

E09 Escritório - aéreo P17

E10 Escritório - TV e prateleira

E11 Sala - painel TV e prateleiras

E12 Sala - banco P20

NC1 Módulos - alturas livres entre planos horizontais CAD

DT1 Detalhe-tipo - fechamento ao teto / P03

Plantas 1:50; elevações e detalhe 1:25.

Imprimir sem ajustar à página; conferir barra de 50 mm.

Caixas CAD são envelopes, não contornos de usinagem.

Fontes: CSV de medidas + Cotas.json + exportação CAD.

Campo medido vence nominal. Branco = pendência.

Ajustes ao teto são estudos separados da CAD.

R00 preservado; esta revisão não foi publicada.

Ver Impacto.json: alterações, fontes e conflitos.

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR


R02 | 00 | 20 folhas | Sem escala

0 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a2996ee63dd6f2f3dc30202...

PL1 | Planta cotada - paredes e aberturas

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

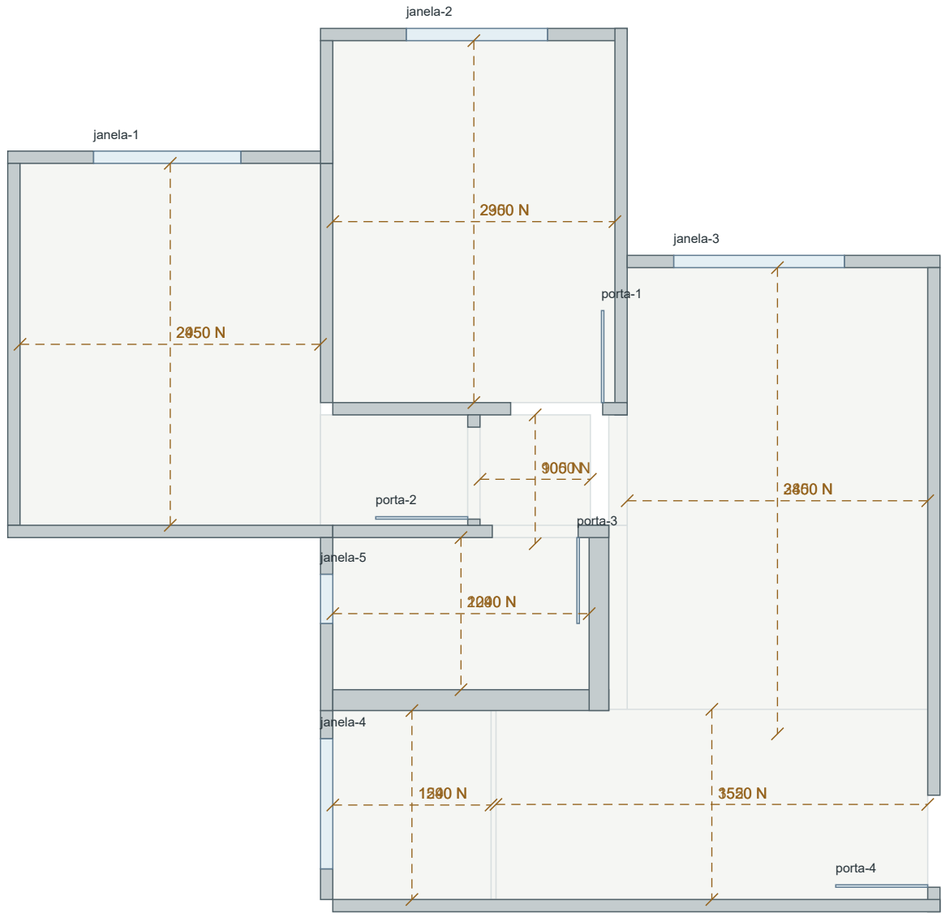

ABERTURAS - dimensões em mm

janela-1 / quarto
L: 1200 N | P: 100 N | peitoril: 950 N | H: 1100 N

janela-2 / escritorio
L: 1150 N | P: 100 N | peitoril: 950 N | H: 1100 N

janela-3 / sala
L: 1390 N | P: 100 N | peitoril: 950 N | H: 1100 N

janela-4 / lavanderia
L: 100 N | P: 1060 N | peitoril: 950 N | H: 1100 N

janela-5 / banho
L: 100 N | P: 400 N | peitoril: 950 N | H: 1100 N

porta-1 / escritorio
L: 20 N | P: 750 N | peitoril: 0 N | H: 2050 N

porta-2 / quarto
L: 750 N | P: 20 N | peitoril: 0 N | H: 2050 N

porta-3 / banho
L: 20 N | P: 700 N | peitoril: 0 N | H: 2050 N

porta-4 / cozinha
L: 750 N | P: 20 N | peitoril: 0 N | H: 2050 N

Planta: X para a direita; Y para baixo. Medidas em mm; imprimir a 100%.

Paredes e aberturas reconstituídas; conferir alinhamentos e espessuras no imóvel.

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | PL1 | 20 folhas | A3 / 1:50


59 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a2996ee63dd6f2f3dc30202...

50 mm no papel = 2500 mm reais

PL2 | Planta de layout - envelopes CAD

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

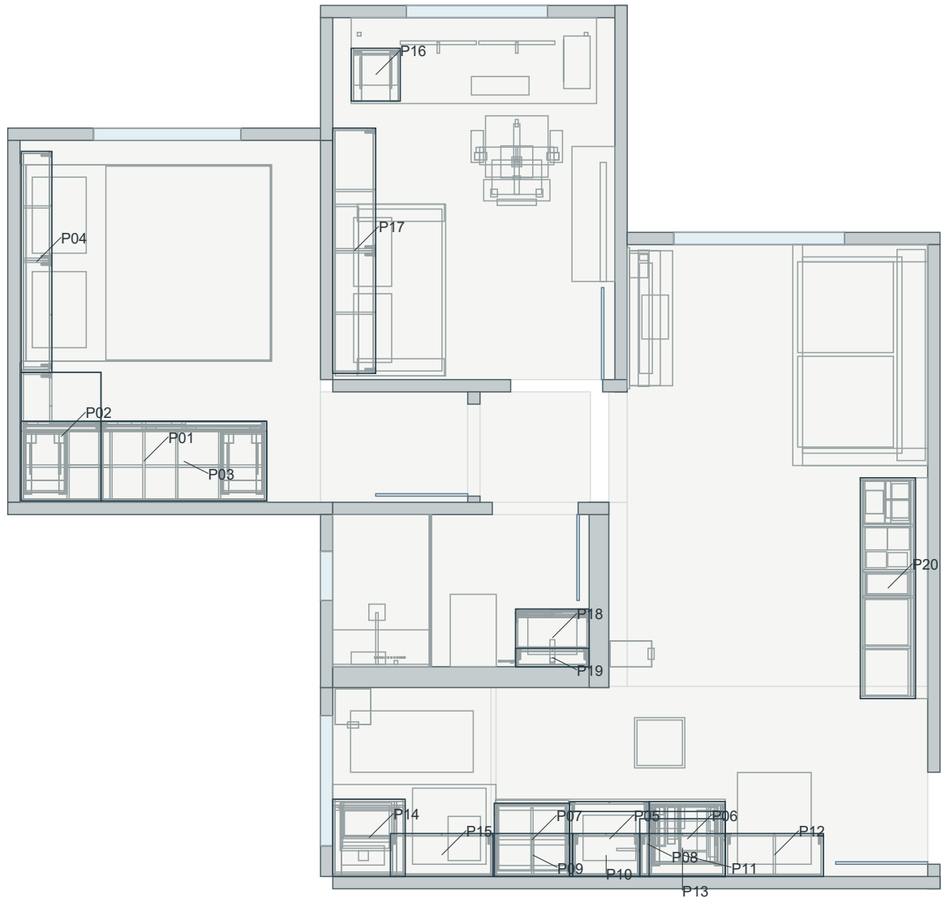

CAD: envelopes de todas as peças visíveis exportadas

P01	2000 N × 650 N × 2132 N
P02	650 N × 1050 N × 308 N
P03	1350 N × 650 N × 308 N
P04	250 N × 1800 N × 308 N
P05	650 N × 610 N × 720 N
P06	619 N × 610 N × 720 N
P07	613 N × 597.5 N × 900 N
P08	1269 N × 530 N × 180 N
P09	650 N × 350 N × 592 N
P10	547 N × 350 N × 1018 N
P11	697 N × 350 N × 610 N
P12	801 N × 350 N × 584 N
P13	697 N × 470 N × 18 N
P14	590 N × 630 N × 920 N
P15	835 N × 350 N × 580 N
P16	400 N × 430 N × 240 N
P17	350 N × 2000 N × 550 N
P18	600 N × 470 N × 545 N
P19	600 N × 150 N × 750 N
P20	450 N × 1800 N × 400 N

Planta: X para a direita; Y para baixo. Medidas em mm; imprimir a 100%.

Paredes e aberturas reconstituídas; conferir alinhamentos e espessuras no imóvel.

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | PL2 | 20 folhas | A3 / 1:50


60 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a2996ee63dd6f2f3dc30202...

50 mm no papel = 2500 mm reais

PL3 | Planta de pontos R01

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

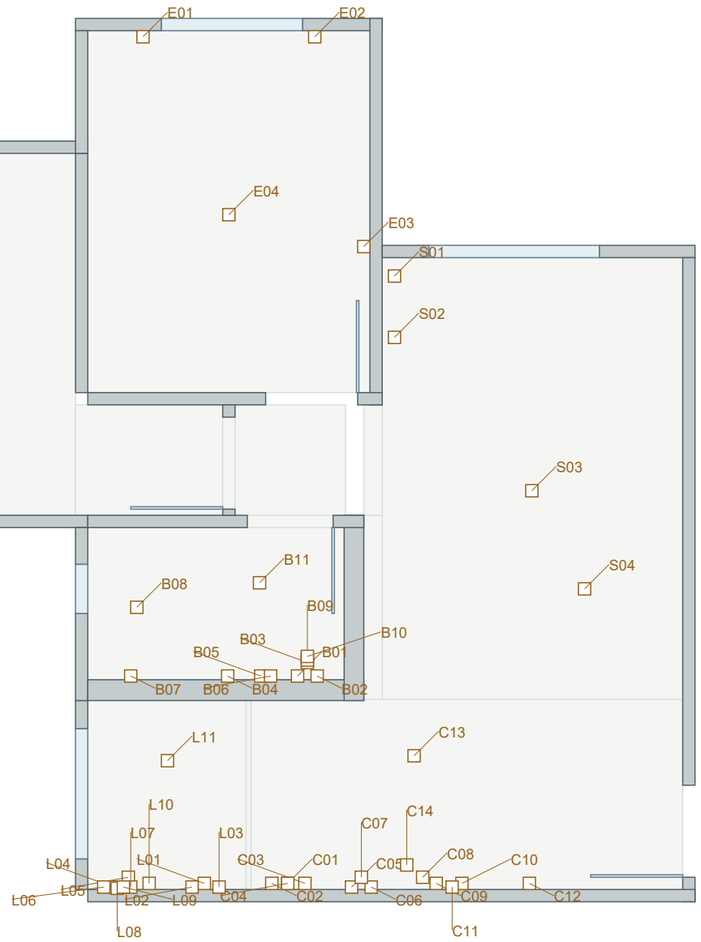

PONTOS R01 / 53 funções

Símbolos na posição nominal herdada; alturas e coordenadas nas folhas PT1/PT2.

C: cozinha; L: lavanderia; B: banheiro; S: sala; E: escritório; Q: quarto.

E06 adiada; Q06, S05 e E05 sem implantação.

Não dimensiona circuitos, tubulação ou proteção.

Conferir pontos da construtora, acessos e manutenção com RT.

Coordenadas X/Y em milímetros nos eixos desta planta.

Planta: X para a direita; Y para baixo. Medidas em mm; imprimir a 100%.

Paredes e aberturas reconstituídas; conferir alinhamentos e espessuras no imóvel.

Q06: sem coordenadas R01
S05: sem coordenadas R01
E05: sem coordenadas R01
E06: sem coordenadas R01

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | PL3 | 20 folhas | A3 / 1:50

98 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a2996ee63dd6f2f3dc30202...

50 mm no papel = 2500 mm reais

PT1 | Pontos R01 - cotas e funções / 1

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

Código / tipo	X / Y / altura (mm)			Função e condição
C01 / D	4180 N	6950 N	300 N	Forno Fischer Infinity 28349-64929 · 127 V · 2061 W
C02 / G	4050 N	6950 N	500 N	Gás GN do cooktop KE4GC
C03 / T	4320 N	6950 N	500 N	Ignição do cooktop
C04 / T	4180 N	6950 N	2000 N	Depurador DE61IX · 127 V
C05 / AF	4700 N	6980 N	550 N	Água fria da pia
C06 / AQ	4860 N	6980 N	550 N	Água quente da pia
C07 / E	4780 N	6900 N	450 N	Esgoto da pia
C08 / T20	5280 N	6900 N	920 N	Torre automática de tomadas 20 A na bancada (área seca)
C09 / T	5390 N	6950 N	1900 N	Micro-ondas ME23P · 127 V
C10 / T	5600 N	6950 N	1100 N	Purificador PE11X bivolt, uso 127 V
C11 / AF	5520 N	6980 N	1100 N	Água fria do purificador
C12 / T	6150 N	6950 N	2000 N	Geladeira IB6S bivolt, uso 127 V
C13 / L	5210 N	5910 N	2600 N	Stella EVO STH21967/30, quadrado 3000 K
C14 / A	5150 N	6800 N	1500 N	COB 3000K sob aéreos +Opus/Shelly/pulsador
L01 / T	3500 N	6950 N	1100 N	Lavadora LG VC4 CV5012PC4 · 127 V
L02 / AF	3400 N	6980 N	900 N	Água fria da lavadora
L03 / E	3620 N	6980 N	800 N	Esgoto da lavadora
L04 / AF	2760 N	6980 N	600 N	Água fria do tanque/Telca
L05 / E	2880 N	6900 N	400 N	Esgoto do tanque
L06 / G	2680 N	6980 N	1400 N	Gás GN do aquecedor Rinnai E21
L07 / T	2900 N	6980 N	1500 N	Aquecedor E21 · alimentação elétrica
L08 / X	2790 N	6990 N	2150 N	Exaustão do aquecedor E21
L09 / AQ	2840 N	6980 N	1400 N	Saída quente E21; destinos de banho/cozinha/Telca a compatibilizar
L10 / T20	3050 N	6950 N	1000 N	Tomada fixa 20 A para air fryer e cafeteira
L11 / L	3200 N	5950 N	2600 N	Firefly 9608 quadrado 3000 K
B01 / AF	4260 N	5260 N	550 N	Água fria do lavatório
B02 / AQ	4420 N	5260 N	550 N	Água quente do lavatório

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | PT1 | 20 folhas | Sem escala

81 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a2996ee63dd6f2f3dc30202...

PT2 | Pontos R01 - cotas e funções / 2

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

Código / tipo	X / Y / altura (mm)			Função e condição
B03 / E	4340 N	5150 N	450 N	Esgoto do lavatório
B04 / AF	3690 N	5260 N	200 N	Água fria do vaso
B05 / AF	3960 N	5260 N	600 N	Ducha higiênica · fria
B06 / AQ	4040 N	5260 N	600 N	Ducha higiênica · quente
B07 / AQ	2900 N	5260 N	1200 N	Chuveiro / misturador Livo (quente e fria)
B08 / E	2950 N	4700 N	0 N	Ralo do box
B09 / A	4340 N	5130 N	1900 N	Espelho 4000 K: Cristallux COB 2x 550 mm /13,2 W
B10 / A	4340 N	5100 N	2300 N	Indireta 3000 K: Brilia 318939 até 2 m /9,6 W
B11 / L	3950 N	4500 N	2500 N	Teto 3000 K: Galaxy Firefly 9605 /25 W /IP44
S01 / T	5050 N	2000 N	300 N	Régua no compartimento ventilado: TV, PS5, soundbar
S02 / T	5050 N	2500 N	1200 N	TV 50″ atrás do painel
S03 / L	6170 N	3750 N	2600 N	Geral smart: Jurerê +2 WiZ +WiZmote, candidata
S04 / L	6600 N	4550 N	2600 N	Jabuticaba triplo +3Brilia 314450 +D1/RM433
E01 / T	3000 N	50 N	850 N	Bancada · notebook
E02 / T	4400 N	50 N	850 N	Bancada · PC CH360, monitores
E03 / T	4800 N	1760 N	1000 N	TV 43″ existente
E04 / L	3700 N	1500 N	2600 N	Geral smart: Jurerê +2 WiZ +WiZmote, candidata
Q01 / A	50 N	1120 N	1100 N	Nordecor EVY2054 branca · lado 1
Q02 / A	50 N	2880 N	1100 N	Nordecor EVY2054 branca · lado 2
Q03 / T	50 N	1050 N	600 N	Tomada de cabeceira · lado 1
Q04 / T	50 N	2950 N	600 N	Tomada de cabeceira · lado 2
Q05 / L	1220 N	2480 N	2600 N	Geral smart Elgin 48D18WSRWIFI: brilho, Alexa/celular
Q06 / A	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE	Cabeceira/face inferior: COB 3000K +Opus/Shelly
S05 / A	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE	TV sala: COB3000K +Opus/Shelly/pulsador
E05 / A	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE	TV escritório: kit WiZ2m e WiZmote próprio
E06 / A	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE	E06 ADIADO: prateleiras escritório, fase futura

Q06-X: a levantar
Q06-Y: a levantar
Q06-Z: a levantar
S05-X: a levantar
+8 avisos: ver Impacto.json

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR


R02 | PT2 | 20 folhas | Sem escala

66 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a2996ee63dd6f2f3dc30202...

E01 | Cozinha - face da bancada e aéreos

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

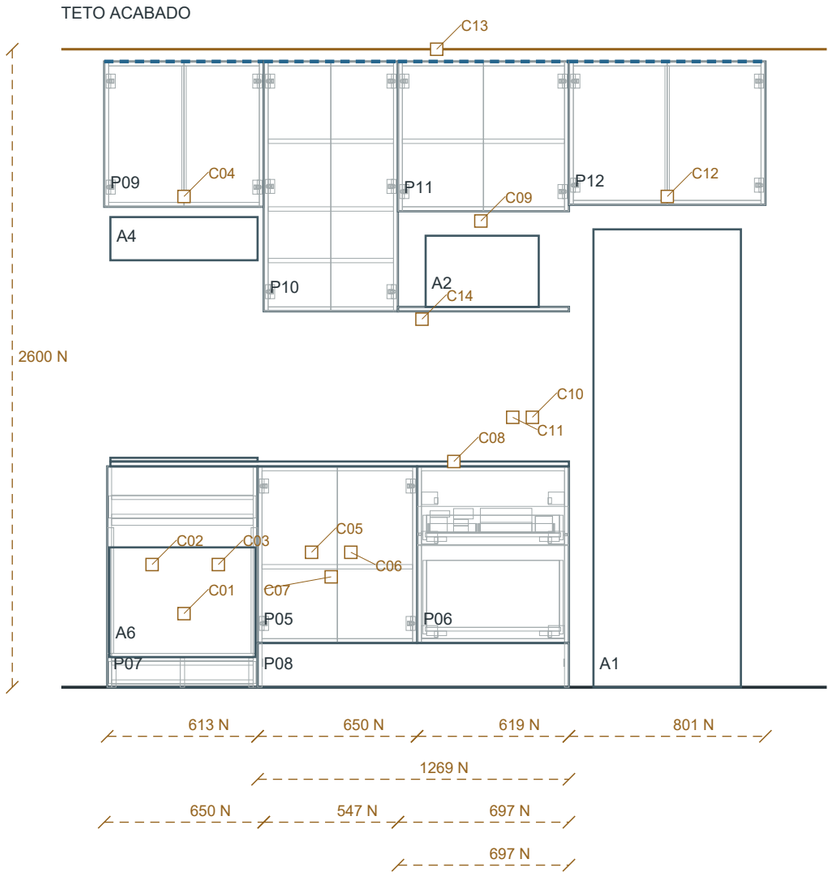

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P05	650 N	180 N	900 N	1700 N
P06	619 N	180 N	900 N	1700 N
P07	613 N	0 N	900 N	1700 N
P08	1269 N	0 N	180 N	2420 N
P09	650 N	1958 N	2550 N	50 N
P10	547 N	1532 N	2550 N	50 N
P11	697 N	1940 N	2550 N	50 N
P12	801 N	1966 N	2550 N	50 N
P13	697 N	1532 N	1550 N	1050 N
A1	601 N	0 N	1866 N	734 N
A2	461 N	1550 N	1840 N	760 N
A3	600 N	920 N	935 N	1665 N
A4	600 N	1740 N	1916 N	684 N
A5	1869 N	900 N	920 N	1680 N
A6	595 N	123 N	570 N	2030 N

P09 H estudo = 592 N; base fixa / topo segue PD

P10 H estudo = 1018 N; base fixa / topo segue PD

P11 H estudo = 610 N; base fixa / topo segue PD

P12 H estudo = 584 N; base fixa / topo segue PD

A1: Geladeira Electrolux IB6S Inox Look

A2: ME23P - corpo documental 461x352x290; folgas separadas R17

A3: Cooktop Electrolux KE4GC

A4: Depurador Suggar DE61IX

A5: Bancada cozinha · reserva de recortes

A6: Fischer · Frente · envelope

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

C01 300 N	C02 500 N	C03 500 N
C04 2000 N	C05 550 N	C06 550 N
C07 450 N	C08 920 N	C09 1900 N
C10 1100 N	C11 1100 N	C12 2000 N
C13 2600 N	C14 1500 N	

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E01 | 20 folhas | A3 / 1:25


106 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a2996ee63dd6f2f3dc30202...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E02 | Cozinha - face oposta / interface da lixeira

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

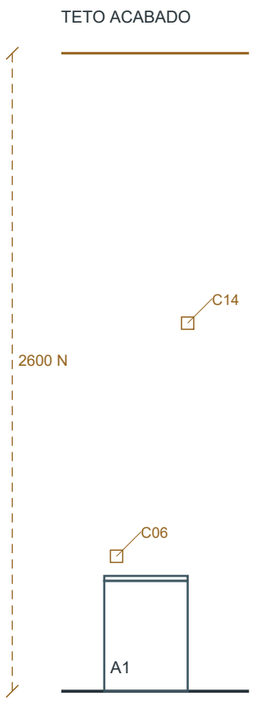

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

A1	340 N	0 N	450 N	2150 N
A2	340 N	450 N	470 N	2130 N

A face oposta não contém módulo de marcenaria na CAD.

Mostra a interface nominal da lixeira junto ao banheiro.

A1: Lixeira comum Biovis Coleta 15 L

A2: Lixeira comum Biovis Coleta 15 L001

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

C01 300 N	C02 500 N	C03 500 N
C04 2000 N	C05 550 N	C06 550 N
C07 450 N	C08 920 N	C09 1900 N
C10 1100 N	C11 1100 N	C12 2000 N
C13 2600 N	C14 1500 N	

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E02 | 20 folhas | A3 / 1:25


37 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a2996ee63dd6f2f3dc30202...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E03 | Lavanderia - tanque, cesto e aéreo

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

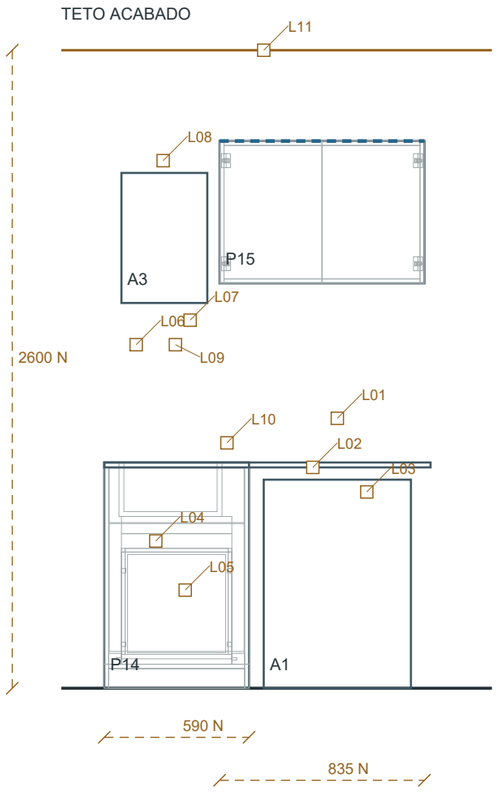

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P14	590 N	0 N	920 N	1680 N
P15	835 N	1650 N	2230 N	370 N
A1	600 N	0 N	850 N	1750 N
A2	1330 N	900 N	920 N	1680 N
A3	350 N	1570 N	2100 N	500 N

P15 H estudo = 580 N; base fixa / topo segue PD

A1: LG VC4 CV5012PC4 Inox Look

A2: Bancada lavanderia · tanque a recortar

A3: Rinnai E21 GN REU-E211 FEH

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

L01 1100 N	L02 900 N	L03 800 N
L04 600 N	L05 400 N	L06 1400 N
L07 1500 N	L08 2150 N	L09 1400 N
L10 1000 N	L11 2600 N	

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E03 | 20 folhas | A3 / 1:25


47 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a2996ee63dd6f2f3dc30202...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E04 | Banheiro - gabinete, bancada e espelho

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

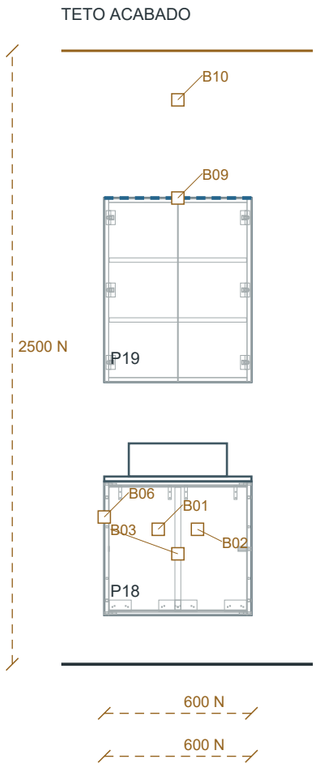

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P18	600 N	200 N	745 N	1755 N
P19	600 N	1150 N	1900 N	600 N
A1	600 N	745 N	765 N	1735 N
A2	400 N	765 N	900 N	1600 N

P19 H estudo = 750 N; base fixa / topo segue PD

A1: Bancada banheiro · cuba a recortar

A2: Cuba Deca Slim branca L.13040.17

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

B01 550 N	B02 550 N	B03 450 N
B04 200 N	B05 600 N	B06 600 N
B07 1200 N	B08 0 N	B09 1900 N
B10 2300 N	B11 2500 N	

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E04 | 20 folhas | A3 / 1:25


43 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a2996ee63dd6f2f3dc30202...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E05 | Roupeiro - P01-P03 e maleiro / face principal

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

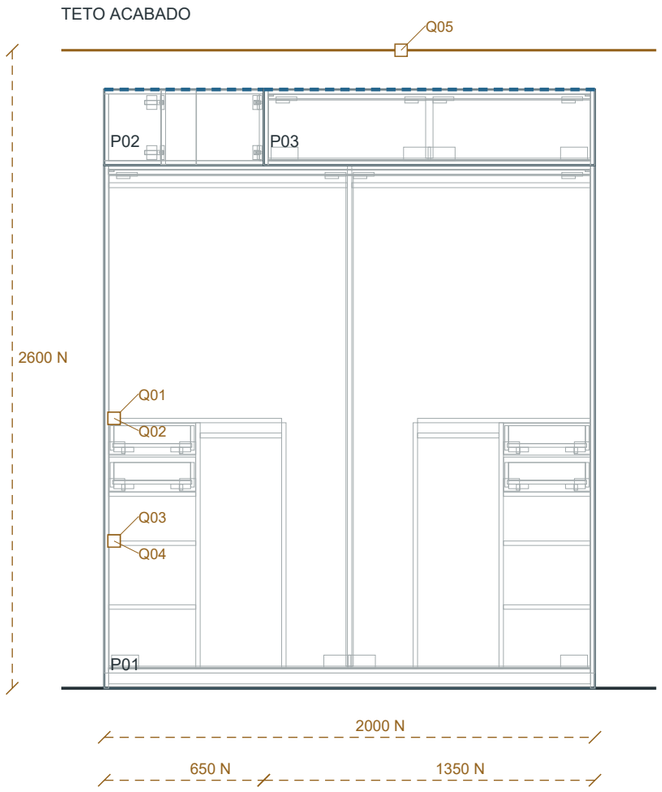

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P01	2000 N	0 N	2132 N	468 N
P02	650 N	2132 N	2440 N	160 N
P03	1350 N	2132 N	2440 N	160 N

P02 H estudo = 308 N; base fixa / topo segue PD

P03 H estudo = 308 N; base fixa / topo segue PD

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

Q01 1100 N	Q02 1100 N	Q03 600 N
Q04 600 N	Q05 2600 N	Q06 PENDENTE

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

Q06-altura: a levantar

Q06-posicao-x: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E05 | 20 folhas | A3 / 1:25


30 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a2996ee63dd6f2f3dc30202...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E06 | Roupeiro - retorno do canto P02

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

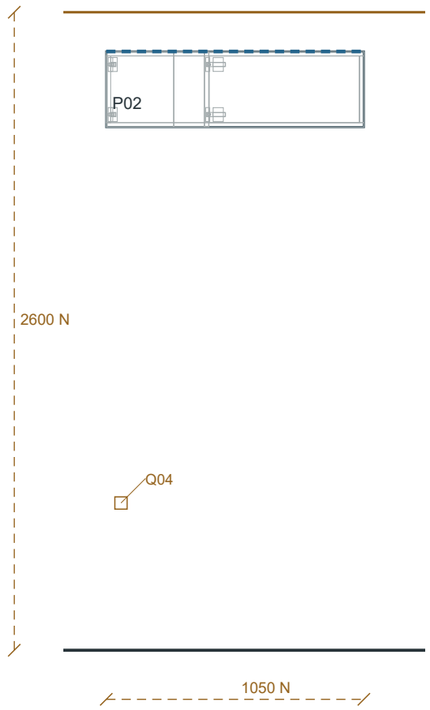

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P02	1050 N	2132 N	2440 N	160 N

P02 H estudo = 308 N; base fixa / topo segue PD

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

Q01 1100 N	Q02 1100 N	Q03 600 N
Q04 600 N	Q05 2600 N	Q06 PENDENTE

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

Q06-altura: a levantar
Q06-posicao-y: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E06 | 20 folhas | A3 / 1:25


18 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a2996ee63dd6f2f3dc30202...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E07 | Quarto - cabeceira e aéreo P04

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

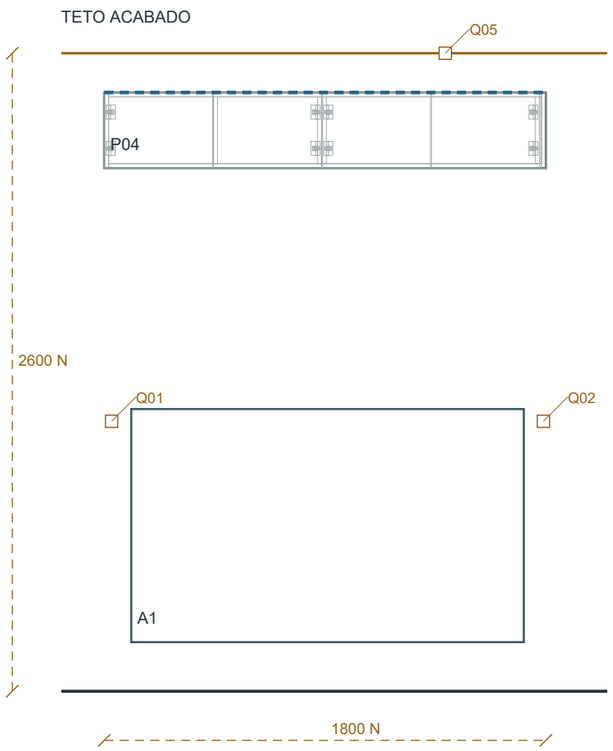

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P04	1800 N	2132 N	2440 N	160 N
A1	1600 N	200 N	1150 N	1450 N

P04 H estudo = 308 N; base fixa / topo segue PD

A1: Cabeceira estofada — dois painéis aprovados / envelope de estudo

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

Q01 1100 N	Q02 1100 N	Q03 600 N
Q04 600 N	Q05 2600 N	Q06 PENDENTE

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

Q06-altura: a levantar
Q06-posicao-y: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E07 | 20 folhas | A3 / 1:25


22 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a2996ee63dd6f2f3dc30202...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E08 | Escritório - bancada e gaveteiro

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

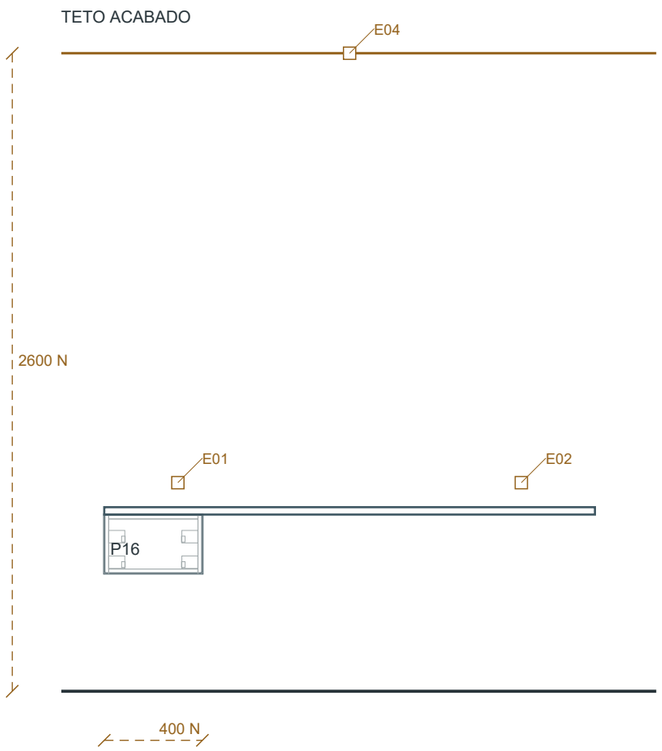

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P16	400 N	480 N	720 N	1880 N
A1	2000 N	720 N	750 N	1850 N

A1: Bancada de trabalho

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

E01 850 N	E02 850 N	E03 1000 N
E04 2600 N	E05 PENDENTE	E06 PENDENTE

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

E05-altura: a levantar
E05-posicao-x: a levantar
E06-altura: a levantar
E06-posicao-x: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E08 | 20 folhas | A3 / 1:25


18 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a2996ee63dd6f2f3dc30202...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E09 | Escritório - aéreo P17

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

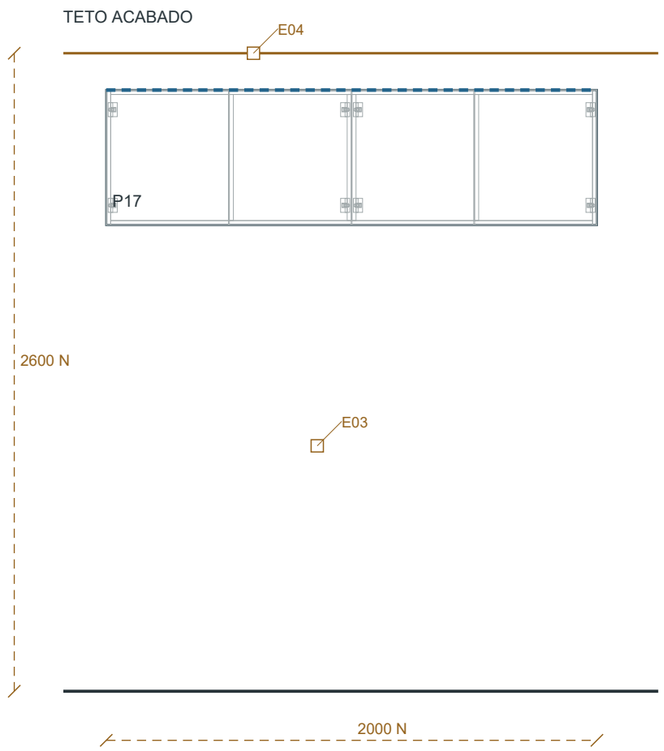

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P17	2000 N	1900 N	2450 N	150 N

P17 H estudo = 550 N; base fixa / topo segue PD

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

E01 850 N	E02 850 N	E03 1000 N
E04 2600 N	E05 PENDENTE	E06 PENDENTE

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

E05-altura: a levantar
E05-posicao-y: a levantar
E06-altura: a levantar
E06-posicao-y: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E09 | 20 folhas | A3 / 1:25


16 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a2996ee63dd6f2f3dc30202...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E10 | Escritório - TV e prateleira

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

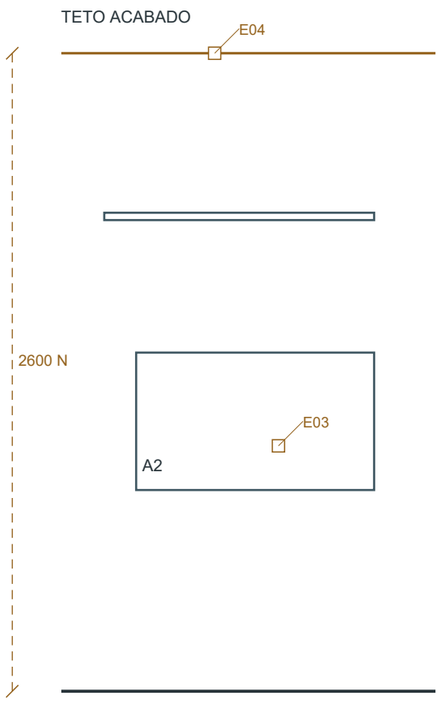

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

A1	1100 N	1920 N	1950 N	650 N
A2	970 N	820 N	1380 N	1220 N

A1: Prateleira alta dos consoles

A2: Samsung 43″ existente

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

E01 850 N	E02 850 N	E03 1000 N
E04 2600 N	E05 PENDENTE	E06 PENDENTE

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

E05-altura: a levantar
E05-posicao-y: a levantar
E06-altura: a levantar
E06-posicao-y: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E10 | 20 folhas | A3 / 1:25


17 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a2996ee63dd6f2f3dc30202...

50 mm no papel = 1250 mm reais

E11 | Sala - painel TV e prateleiras

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

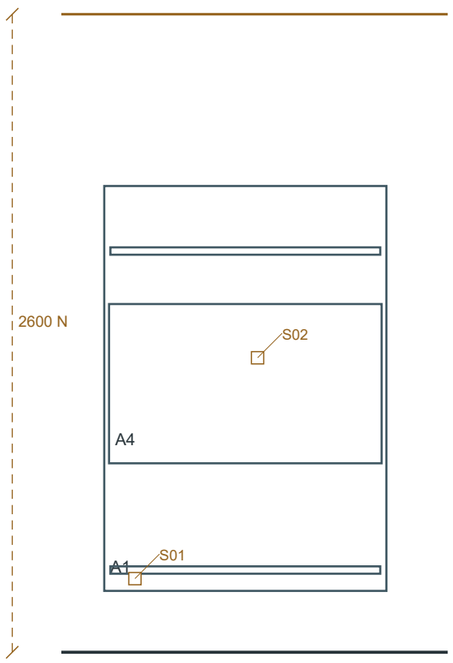

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

A1	1150 N	250 N	1900 N	700 N
A2	1100 N	320 N	350 N	2250 N
A3	1100 N	1620 N	1650 N	950 N
A4	1111 N	770 N	1419 N	1181 N

A1: Painel liso da TV
A2: Uma prateleira acima e outra abaixo da TV
A3: Uma prateleira acima e outra abaixo da TV001
A4: TV 50″ · preferência Ambilight

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

S01 300 N	S02 1200 N	S03 2600 N
S04 2600 N	S05 PENDENTE	

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

S05-altura: a levantar
S05-posicao-y: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E11 | 20 folhas | A3 / 1:25

25 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a2996ee63dd6f2f3dc30202...


50 mm no papel = 1250 mm reais

E12 | Sala - banco P20

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

MÓDULO / L / BASE / TOPO CAD / FOLGA TETO

P20	1800 N	0 N	400 N	2200 N

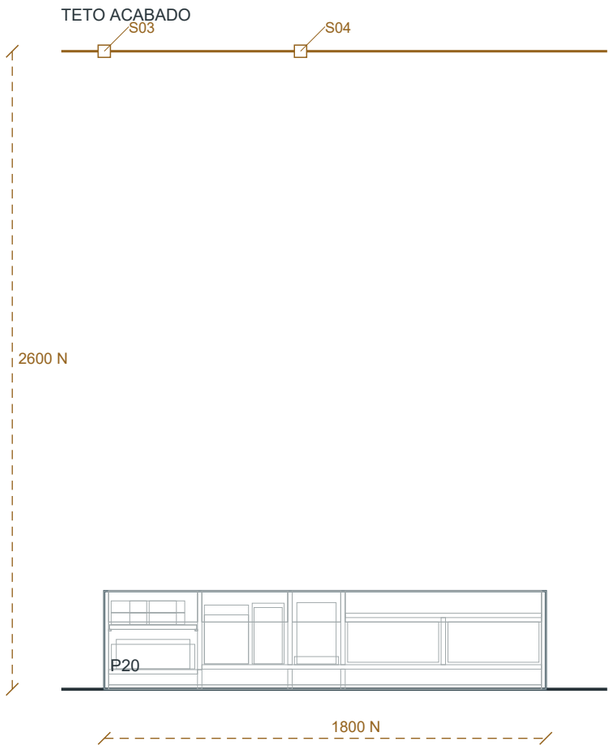

PONTOS DO AMBIENTE: altura / ver PT1-PT2

S01 300 N	S02 1200 N	S03 2600 N
S04 2600 N	S05 PENDENTE	

Traço azul: topo paramétrico; caixas cinza: CAD fixa.

Ajuste dimensional não define corte, fixação ou montagem.

S05-altura: a levantar
S05-posicao-y: a levantar

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | E12 | 20 folhas | A3 / 1:25

14 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a2996ee63dd6f2f3dc30202...

50 mm no papel = 1250 mm reais

NC1 | Módulos - alturas livres entre planos horizontais CAD

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

Módulo	Vãos verticais entre envelopes / de baixo para cima / mm
P01	Sem par de planos horizontais identificável no envelope.
P02	272 N
P03	272 N
P04	272 N
P05	284 N
P06	31 N / 369 N
P07	Sem par de planos horizontais identificável no envelope.
P08	Sem par de planos horizontais identificável no envelope.
P09	556 N
P10	180 N / 192 N / 258 N / 298 N
P11	258 N / 298 N
P12	548 N
P13	Sem par de planos horizontais identificável no envelope.
P14	532 N
P15	544 N
P16	204 N
P17	514 N
P18	Sem par de planos horizontais identificável no envelope.
P19	226 N / 226 N / 226 N
P20	Sem par de planos horizontais identificável no envelope.

Triagem geométrica: planos que cobrem ao menos metade da largura e profundidade do módulo.

Não confirma vão útil de porta, gaveta, recorte ou ferragem; conferir peça específica antes de executar.

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR


R02 | NC1 | 20 folhas | Sem escala

21 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a2996ee63dd6f2f3dc30202...

DT1 | Detalhe-tipo - fechamento ao teto / P03

GUEDALA PARK / CADERNO R02 / GEOMETRIA E COTAS

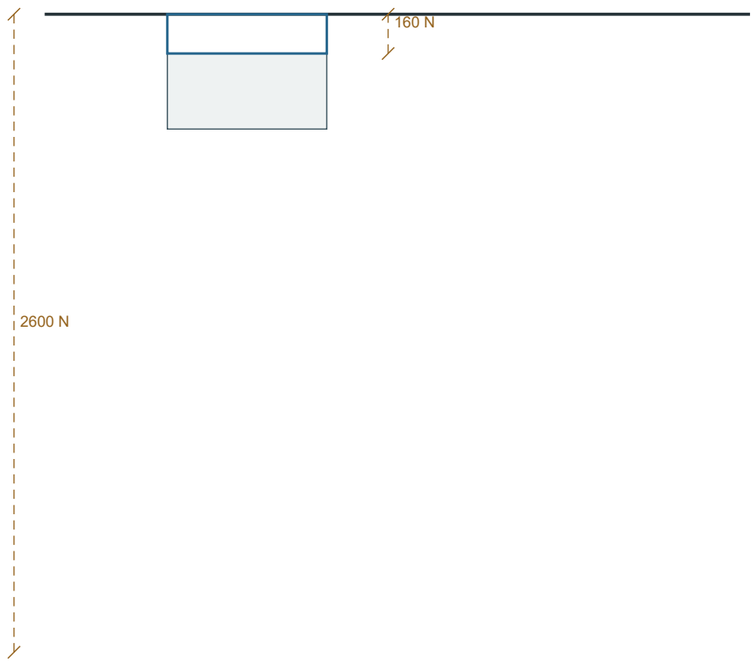

Altura do fechamento = PD efetivo - topo da caixa CAD

Resultado: 160 N

Envelope de estudo; espessura, juntas e acesso de montagem com oficina/RT.

Não representa nova peça incorporada ao FCStd.

Não reduzir automaticamente peças existentes para ocultar conflito.

P03 e aéreos: altura de estudo = PD - folga nominal - base CAD.

Conferir teto em vários pontos; usar altura livre limitante no CSV.

N / tracejado: planta ou nominal (inclui CAD e derivadas com parcela nominal)

M / contínuo: medido; derivada M somente quando todas as parcelas são medidas

ESTUDO — NÃO EXECUTAR

R02 | DT1 | 20 folhas | A3 / 1:25

2 cotas nominais | RT: _____

CAD SHA256: 4a2996ee63dd6f2f3dc30202...

50 mm no papel = 1250 mm reais
